



RAPORT DE EVALUARE
A
IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

07.12.2016 - 01.10.2018



FEBRUARIE 2019

CUPRINS

1. PREFAȚĂ	2
2. REZUMAT	4
3. CONTEXT	10
4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII	15
5. METODOLOGIA DE EVALUARE	17
6. CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII	21
6.1 Situația pe măsurile SDL la <u>01.10.2018</u> , sM 19.2	28
6.2 Situația sumelor SDL la <u>01.10.2018</u> , pe sM 19.4 - Funcționarea GAL	35
6.3 Centralizarea și rezultatele chestionarelor	36
7. CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE	44

1. PREFAȚĂ

Documentul conține date aferente evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Valea Muntelui 2014-2020, pentru perioada **07.12.2016 - 01.10.2018**. El pune la un loc date relevante privind disponibilitatea inițială de fonduri la nivelul GAL și etapele aferente selecției de proiecte, cu o evidențiere elocventă asupra stadiului acestora.

Acțiunea de evaluare s-a desfășurat ca urmare a contextului legislativ european trasat de către Uniunea Europeană prin Reg. UE 1303/2013 în care se precizează:

Art. 34 (par 3, lit g):

”Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele:

(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.”

Art. 35 (par 1, lit d):

”Sprijinul din fondurile ESI în cauză pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității acoperă:


(d) costuri de funcționare legate de gestionarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, constând în costuri curente, costuri de personal și de formare, costuri privind relațiile publice, costuri de natură financiară, precum și costurile legate de activitățile de monitorizare și de evaluare a strategiei respective, astfel cum sunt menționate la articolul 34 alineatul (3) litera (g);”

Activitatea de evaluare propriu-zisă a început în luna noiembrie 2018 și a fost finalizată la sfârșitul lunii ianuarie 2019, cu o verificare și completare până la sfârșitul lunii februarie 2019.

GAL Valea Muntelui este un ONG, o asociație înființată în 19.09.2011 și se află la implementarea celei de-a doua SDL pe teritoriul format din comunele Agăș, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeș-Făget, Palanca, Poduri și orașul Dărmănești, din județul Bacău. Prima SDL a fost aferentă primei selecții și autorizări de GAL-uri la nivelul României în perioada 2007-2013, iar cea doua perioadă este cea actuală, 2014-2020. Toate cele 8 localități au fost membre în cadrul GAL Valea Muntelui de la data înființării și până în prezent.


La nivelul Adunării Generale există **39 de membrii**, din care **9 sunt din sectorul public (23,08%)**, **17 din sectorul privat economic (43,59%)** și **13 din societatea civilă (33,33%)**.

Strategiei de Dezvoltare Locale a GAL i-au fost aprobate fonduri în valoare de 3.106.684,31 euro, din care 2.485.347,45 euro (80%) pentru finanțarea de proiecte în teritoriu, aferente sM 19.2 și 621.336,86 euro (20%) pentru funcționarea GAL, sM 19.4.

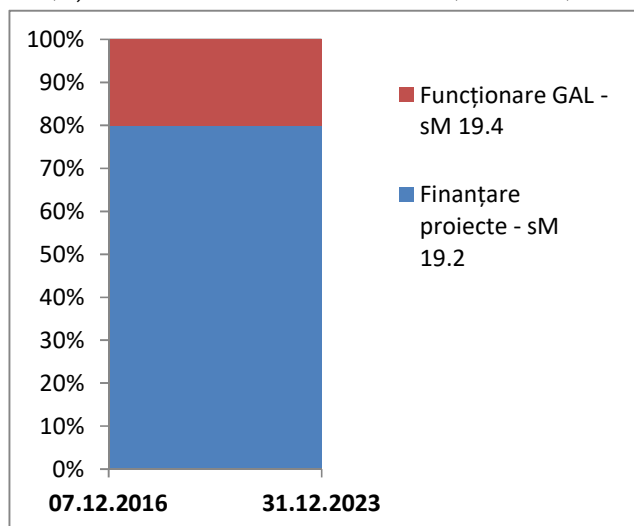

La nivelul GAL Valea Muntelui, funcționarea prin sM 19.4, a fost repartizată pe cele 3 etape astfel:


- 2016-2019 - 445,123.47€
- 2020-2021 - 114,079.39€
- 2021-2022 - 62,134.00€

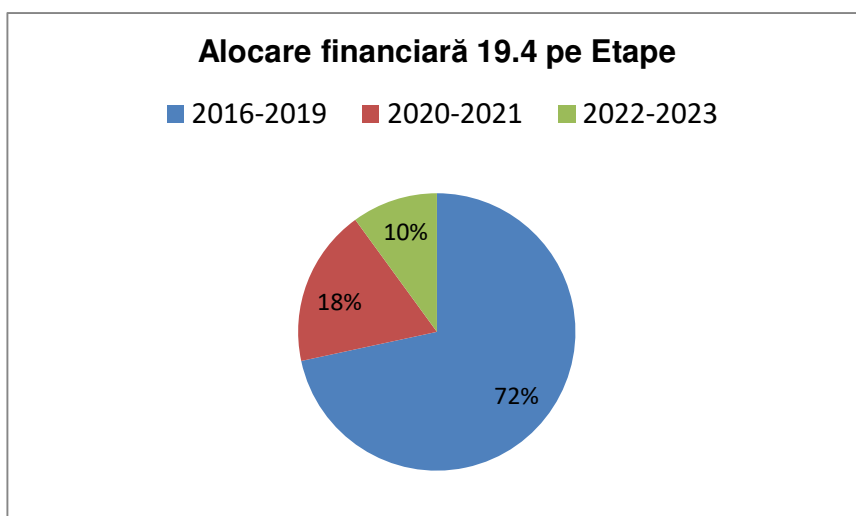


În vederea elaborării prezentului document, Consiliul Director al GAL a emis o Decizie prin care a aprobat Planul de evaluare și a numit Comitetul de Coordonare al evaluării precum și atribuțiile echipei de implementare/realizare a Raportului de evaluare propriu-zis.

2. REZUMAT

Alocarea financiară inițială a SDL, aferentă finanțării de proiecte pe sM 19.2, în valoare de 2.485.347,45 euro, a fost aprobată de către Adunarea Generală spre a fi repartizată pe 11 Măsurile astfel:

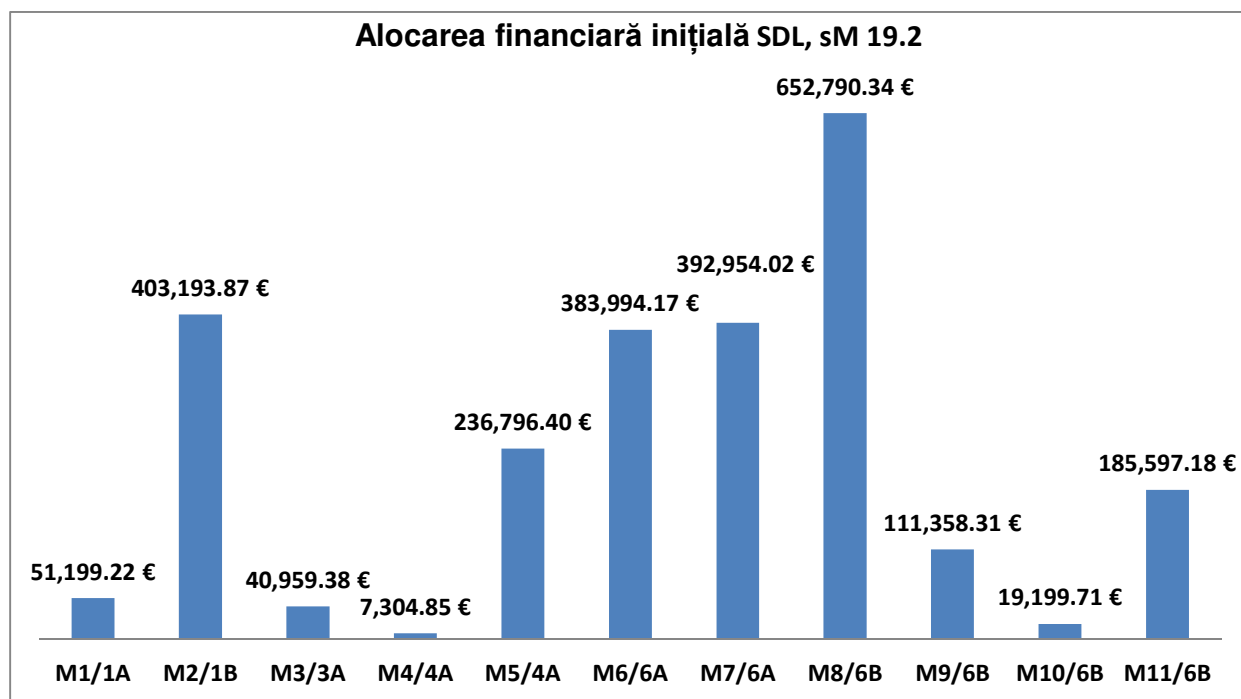


Până la data de 01.10.2018 au fost lansate 3 Apeluri de Selecție astfel:

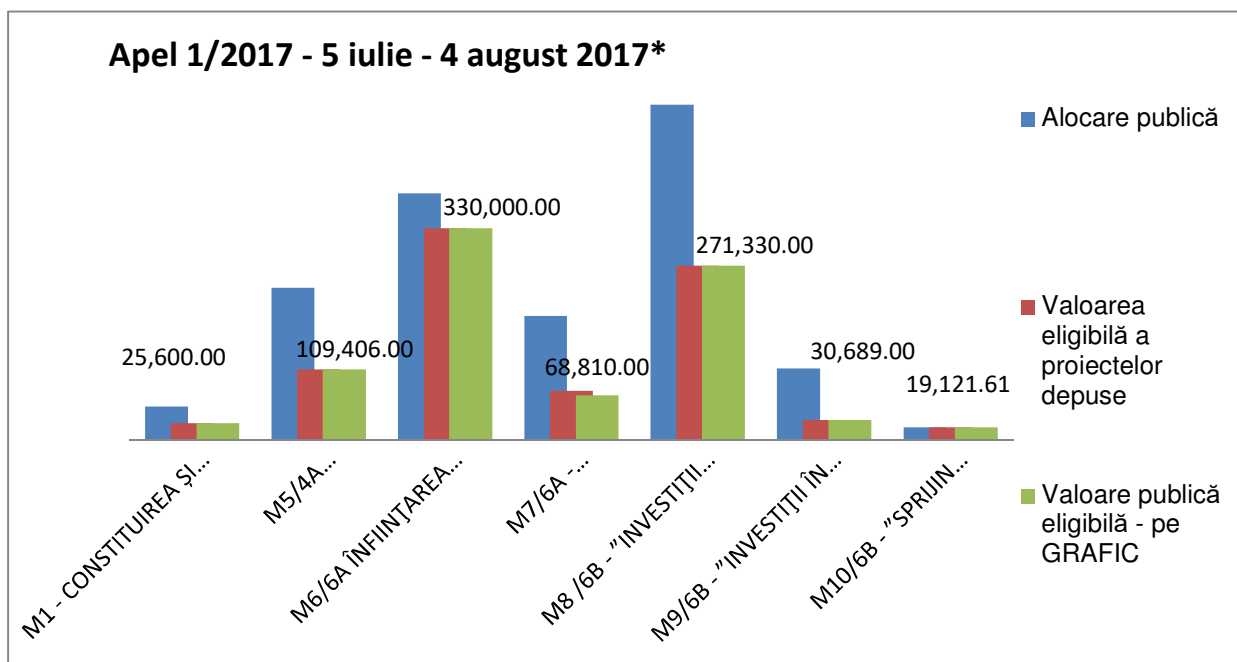

*) M6, M9, M10 - au fost prelungite până în data de 18.08.2017.


În cadrul Apelului de Selecție 1 au fost lansate 7 măsuri cu o valoare de 1,848,292.17 euro, au fost primite 12 proiecte cu o valoare eligibilă la GAL de 854,956.61 euro. Dintre acestea, 3 proiecte în valoare de 94,721.61 euro au fost declarate neeligibile de către AFIR, restul de 9 proiecte având o valoare eligibilă și selectată de 760,235.00 euro. Aceste 9 au fost și contractate la CRFIR Nord-Est Iași cu valoarea totală de 753,240.00 euro.

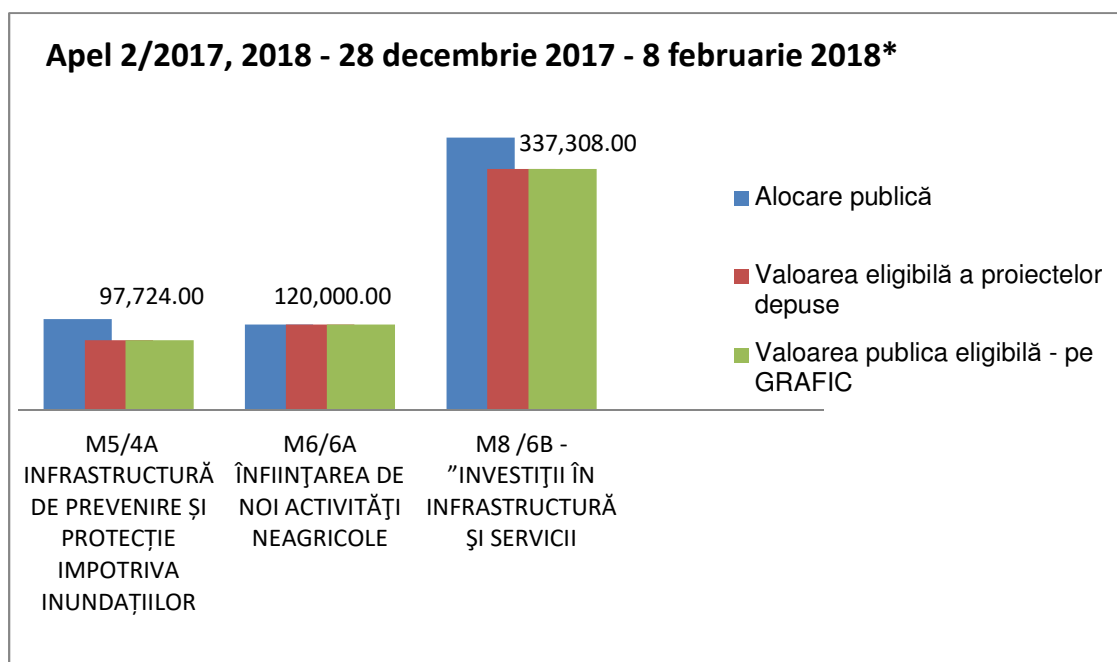

*) - M7/6A a fost prelungită până în 21 mai 2018

- În cadrul Notei nr. 216490 privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, COMPLEXĂ - anul 2018 a Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Muntelui, jud. Bacău din 24.08.2018 a fost suplimentată suma aferentă MĂSURII 6/6A ÎNFIINȚAREA DE NOI ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE, de la 383.994,17 euro la 400.000 euro.


În cadrul Apelului de Selecție 2 au fost lansate 3 măsuri cu o valoare de 628,850.74 euro, au fost primite 6 proiecte cu o valoare eligibilă la GAL de 555,032.00 euro. Dintre acestea, 1 proiect în valoare de 70,000.00 euro a fost declarat neeligibil la AFIR, restul de 5 proiecte având o valoare eligibilă și selectată de 485,032.00 euro. Aceste 5 proiecte au fost și contractate la CRFIR Nord-Est Iași cu valoarea totală de 484,120.00 euro.

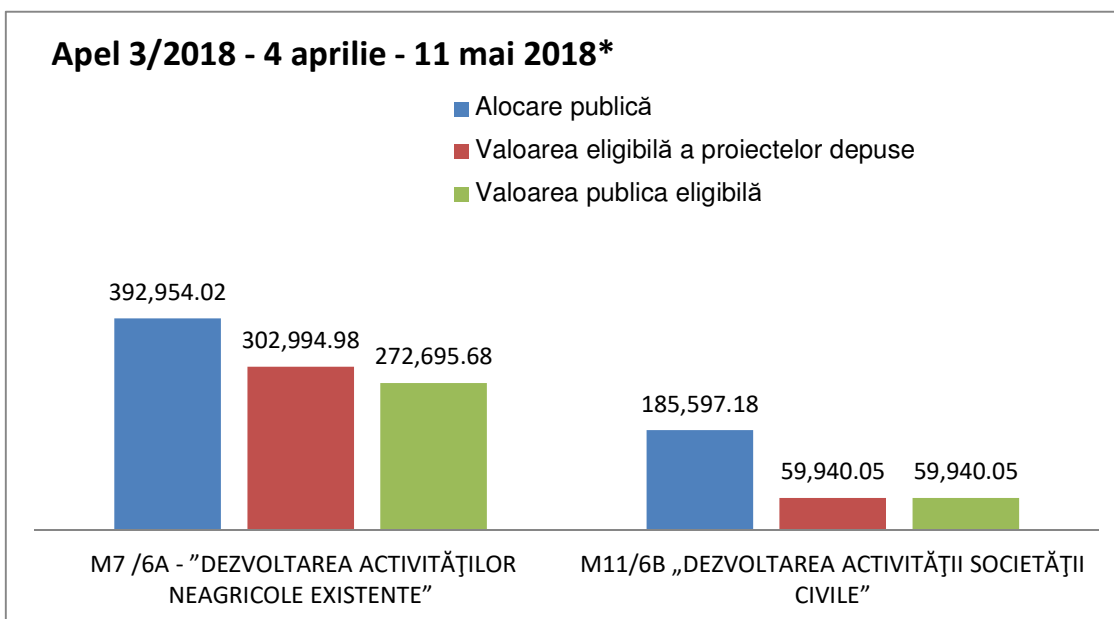

În cadrul Apelului de Selecție 3 au fost lansate 2 măsuri cu o valoare de 578,551.20 euro, au fost primite 4 proiecte cu o valoare eligibilă la GAL de 332,635.73 euro. Dintre acestea, 1 proiect în valoare de 100,000.00 euro a fost declarat neconform la GAL, restul de 3 proiecte având o valoare eligibilă și selectată de 232,635.73 euro. Dintre acestea un proiect a fost contractat la CRFIR Nord-Est Iași cu valoarea totală de 59,940.05 euro.


GAL Valea Muntelui a lansat, până la 01.10.2018, 8 măsuri prin 3 Apeluri de Selecție cu o valoare publică totală de 2,033,889.35 euro. Pe această sumă au aplicat și au fost evaluate 22 de proiecte. Dintre acestea 4 au fost declarate neeligibile la nivelul AFIR și unul neconform la nivelul GAL. Valoarea eligibilă selectată la AFIR a fost de 1,477,902.73 euro pentru un număr de 17 proiecte, valoarea contractată de către acestea este de 1,297,300.05 euro, iar valoarea sumelor plătite de AFIR pe aceste proiecte este de 231,000.00 euro.

Raportându-ne la valoarea totală disponibilă pe SM 19.2 de 2,485,347.45 euro se poate contura imaginea prin care GAL Valea Muntelui a lansat **81,84%** din fondurile disponibile, având **59,46%** valoare eligibilă și selectată la AFIR, **52,20%** valoare contractată a proiectelor și un procent de **9,29%** total sumă plătită beneficiarilor.

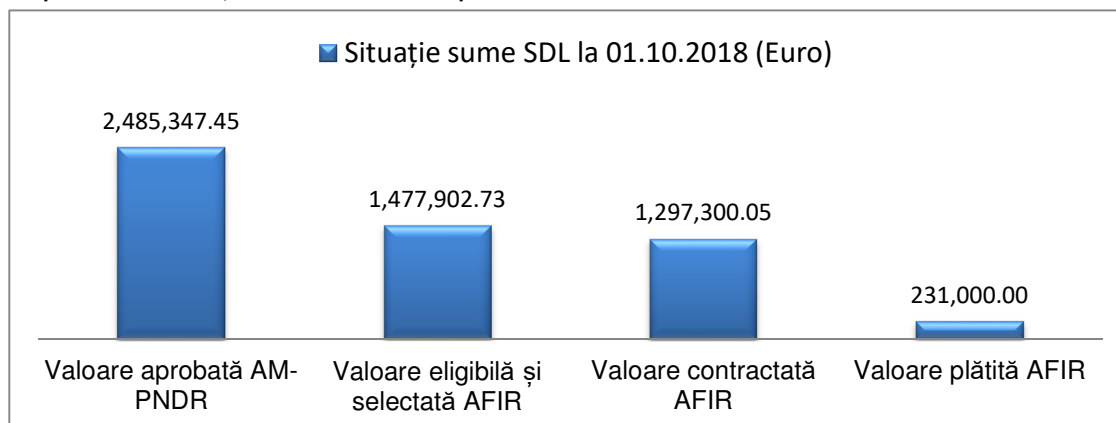

Totodată, prin proiectele depuse beneficiarii, atât publici cât și privați, și-au asumat atât contribuții proprii cât și sume neeligibile, jumătatea din valoarea acestora din urmă fiind reprezentate de TVA.

Astfel contribuția solicitanților privați este de 26,818.24 euro iar valoarea sumei neeligibile asumată de aceștia este de 79,265.55 euro. Solicitanții publici și-au asumat o valoare neeligibilă de 338,092.00 euro pentru implementarea proiectelor depuse. Rezultă astfel o **sumă complementară celei SDL** asumată de solicitanți în valoare totală de **444,175.79 euro**, ce reprezintă **17,87%** din valoarea totală aprobată SDL.

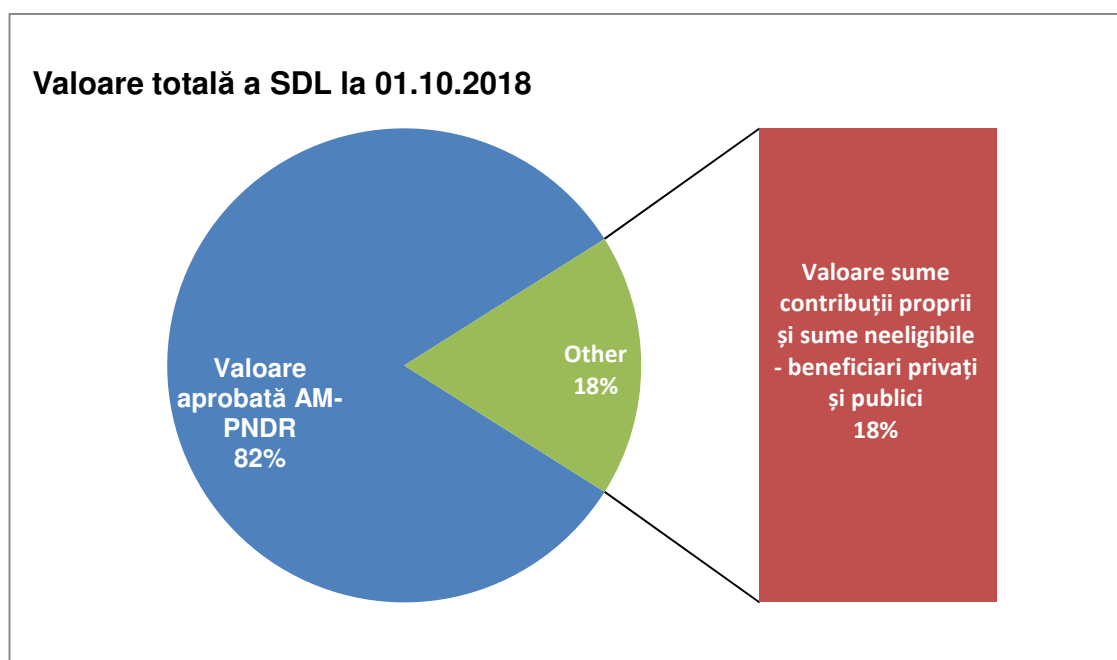

Diferența de sume din măsurile lansate a fost selectată și depusă la AFIR în luna ianuarie 2019, cât și măsurile ce nu au fost lansate până la 01.10.2018 vor fi deschise până în luna aprilie a anului 2019, astfel încât până în decembrie 2019 toate măsurile și sumele rămase disponibile să fie contractate.

Un indicator important la nivelul SDL este cel al locurilor de muncă. Astfel că la momentul aprobării SDL au fost preconizate a fi create **14 noi locuri de muncă**, rezultatul la 01.10.2018 este că au fost selectate proiecte ce și-au asumat crearea a **19 noi locuri de muncă**.

Desigur că nu doar contractarea constituie miza echipei tehnice a GAL. În baza procedurilor interne de lucru¹, ulterior contractării fiecărui proiect, angajații GAL vor

¹ <http://www.galvalemuntelui.ro/sesiuni-proiecte/proceduri-de-lucru.html>

monitoriza stadiul implementării proiectelor, astfel încât indicatorii asumați inițiali să fie atinși și proiectele GAL să producă rezultate concrete la nivelul teritoriului.

Până la acest moment se poate discuta de o relație bazată pe profesionalism și încredere a solicitanților, beneficiarilor față de angajații GAL. În majoritatea situațiilor ce apar la fiecare proiect, angajații GAL sunt consultați.

Referitor la Logica de Intervenție a SDL, în perioada supusă prezentului raport de evaluare au fost efectuate **două modificări complexe de Strategie**, una în 2017² și una în 2018³. Ambele modificări sunt detaliate în documentele către care se face referire în notele de subsol, unde se regăsesc de asemenea Notele de aprobare emise de către DGDR AM-PNDR.

Dacă la modificarea din 2017 majoritatea modificărilor s-au făcut pentru corelări legislative în cadrul măsurilor, dar și cu sumele aferente unităților de bonusare atribuite procedurii de selecție a SDL, alături de majorarea sprijinului aferent activităților economice non-agricole, modificarea din 2018 a vizat câteva aspecte mai importante, apărute din nevoia identificată la nivelul teritoriului pentru realizarea de proiecte ce țin de Art. 35, cât și realocarea de sume între măsuri, de la cele unde au fost atinși indicatorii și s-au făcut economii, către cele unde s-a observat interes ca urmare a deplasărilor de animare repetate în teritoriu și consultării continue cu potențiali solicitanți. Totodată, în vederea menținerii indicatorilor asumați inițial, a fost introdusă o nouă măsură de finanțare M12/1C.

Obiectivele cât și indicatorii asumați la momentul realizării strategiei îi considerăm realizabil, și chiar ușor peste ceea ce s-a propus.


De la 01.10.2018 vor mai fi lansate minim 3 Apeluri de Selecție pentru sumele rămase neselectate. Din întâlnirile de animare avute estimăm că până la începutul lunii decembrie 2019, toate sumele disponibile prin măsurile SDL GAL Valea Muntelui vor fi contractate și indicatorii atinși.

Urmărind răspunsurile date de către beneficiari cât și de persoanele chestionate pe partea de promovare/vizibilitate a GAL-ului/eventimentelor organizate de GAL, se observă faptul că aceștia sunt foarte mulțumiți la capitolul de relaționare cu angajații GAL privind obținerea de informații, clarificarea unor chestiuni legate de documentele de completat și furnizat, cât și a evaluării propriu-zise a proiectelor

² http://www.galvalemuntelui.ro/Documente/2017/sdl/nota_aprobare_startegie.pdf

³ http://www.galvalemuntelui.ro/Documente/2018/sdl/SDL_GAL-VALEA_MUNTELUI_2014-2020_cu_anexe_modificata_la_24.08.2018.pdf

Schema modificării complexe a SDL nr.1/2018:

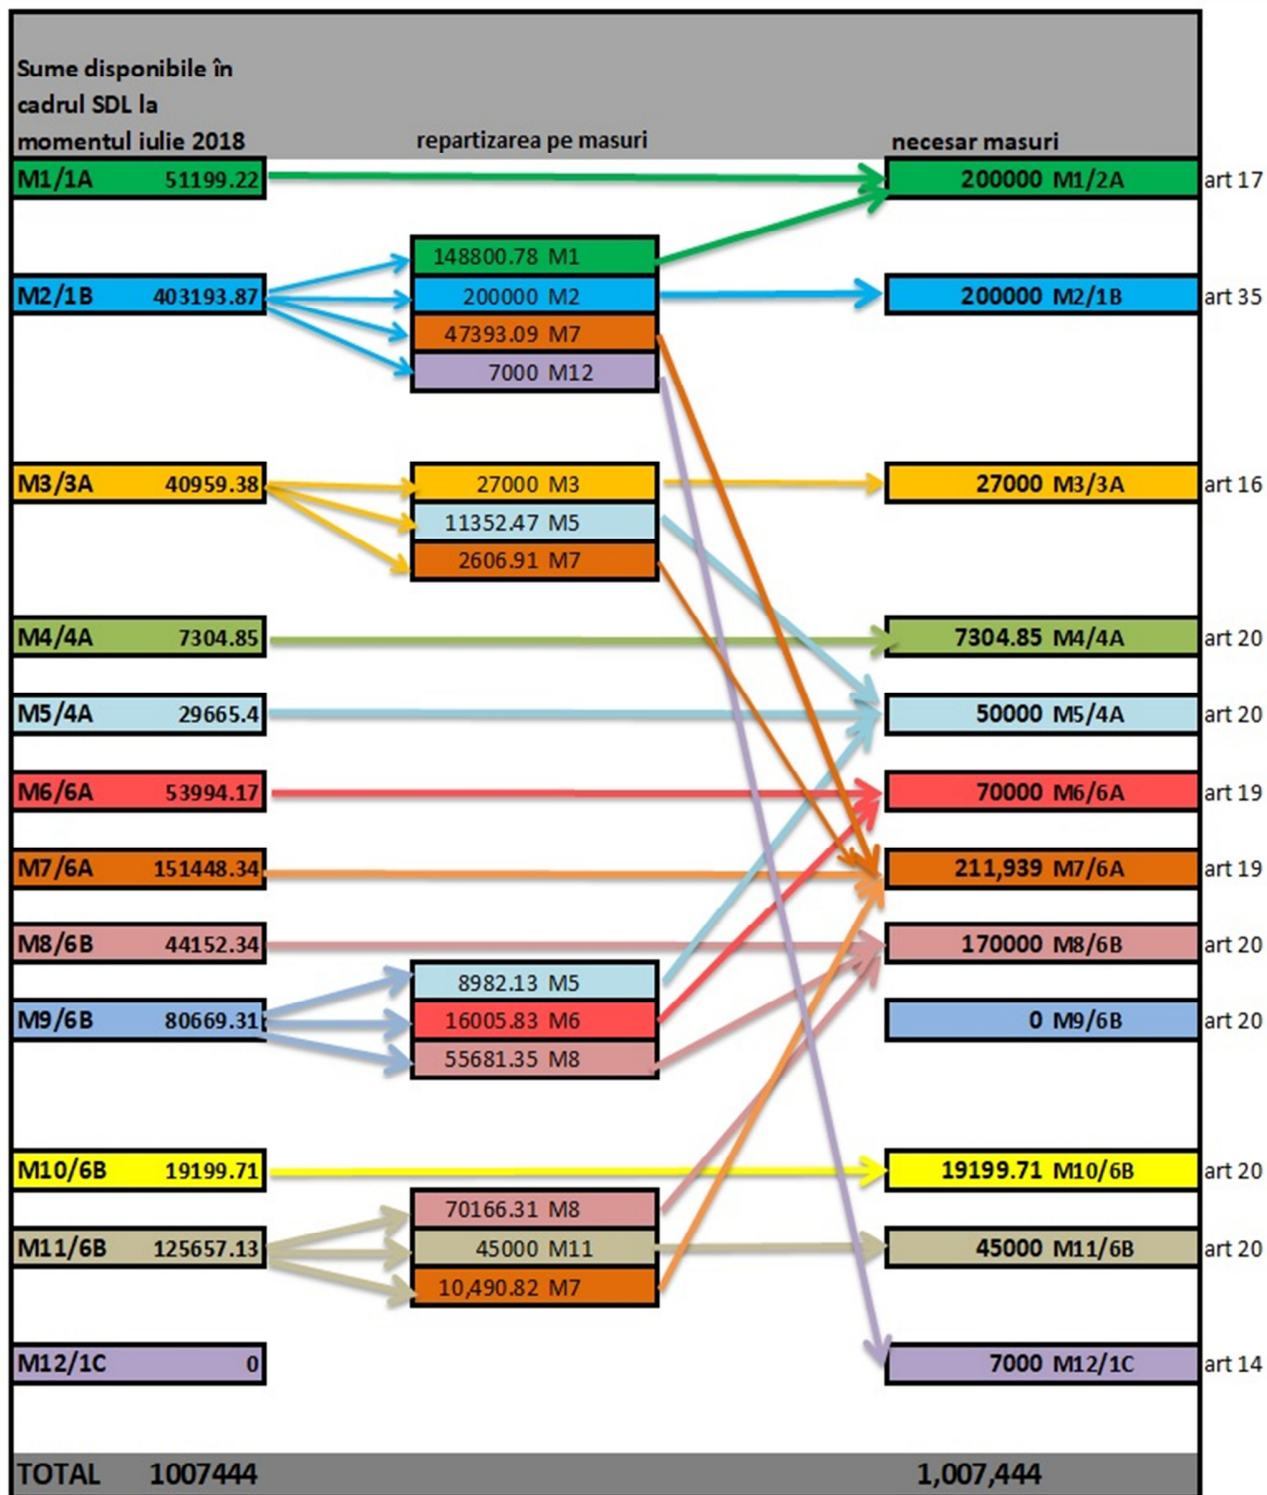

3. CONTEXT


Teritoriul deservit de Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui este localizat în zona de Nord-Vest a județului Bacău și face parte din Regiunea Nord-Est a României, Moldova, cum e cunoscută din denumirea istorică a regiunilor vechi ce formează astăzi România.

Componența GAL-ului este dată de teritoriul a 8 localități, situate pe parcursul bazinului râului Trotuș. Localitățile componente reprezintă 7 comune, respectiv Agăș, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeș-Făget, Palanca, Poduri și orașul Dărmănești. În vecinătatea de Nord a teritoriul GAL este județul Neamț, în cea de Vest județul Harghita și Covasna, iar în apropiata vecinătate de Sud și Est, sunt județele Vrancea și Vaslui.

În partea centrală a teritoriului, pe două linii comune de transport, respectiv DN 12A și DN 2G, există vecinătatea cu orașul Comănești și municipiul Moinești, cele două așezări urbane totalizând o populație de 41.355 de locuitori.¹ De asemenea mai există și 4 drumuri județene, respectiv DJ 116D, DJ 123, DJ 117 și DJ 116B, ce asigură atât legătura a 4 localități cu drumurile naționale cât și principala rută de acces din interiorul acestor localități.

La nivelul județului Bacău există 7 GAL-uri autorizate de AM-PNDR, GAL Valea Muntelui fiind reprezentat cu numărul 21 în ordinea alfabetică după numele județelor în evidența națională:

GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ DIN JUDEȚUL BACĂU

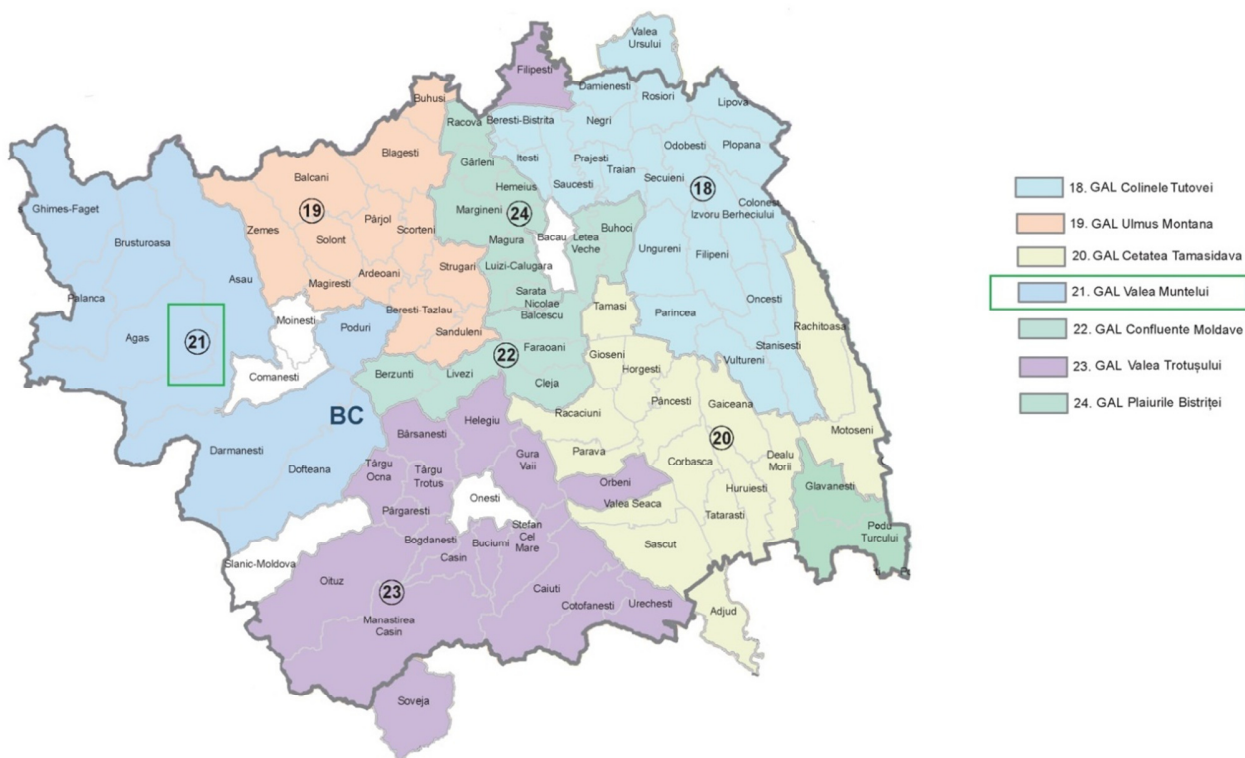



Comuna Asău, sat Straja, nr. 241, județul Bacău,
cod poștal 607026, Tel./Fax.: 0234 382 091, www.galvalemuntelui.ro,
office@galvalemuntelui.ro, galvalemuntelui@yahoo.com

Populația totală a teritoriului este de 52.688 locuitori, cu o ușoară superioritate a genului masculin, 50,45% față de cel feminin 49,54%. Structura de vârstă la nivelul teritoriului se prezintă astfel: 18,93% populație tânără (0-14 ani), 64,24% populație adultă (15-64 ani) și 16,82% populație vârstnică (65+ de ani).

Teritoriul zonei Valea Muntelui acoperă o suprafață de 1.402,32 km² iar densitatea populației este de 37,57 locuitori/km².

Teritoriul este preponderent muntos, făcând parte din unitatea geomorfologică a Carpaților Orientali, subunitatea Munților Tarcău, însă conține și structuri de deal, ce constituie împreună un relief variat cu directe influențe asupra mediului economic și social al întregii zone. Zona este majoritar montană, 7 din cele 8 UAT-uri fac parte din categoria de Zone montane, acoperind 94,81% din suprafața totală a teritoriului.

Economia locală este bazată în principal pe sectoarele de comerț (30,7%), servicii (27,6%) și industrie (18,9%), ultimele locuri fiind ocupate de agricultură, silvicultură, pescuit (13,2%) și construcții (9,6%).

În zona de prelucrare, ramura cea mai dezvoltată rămâne în continuare cea a prelucrării lemnului, din păcate încă exploatată majoritar în zona primară. Totuși, datorită anumitor factori legislativi și de concurență locală există o ușoră tendință spre

creșterea segmentelor de realizare a produselor finite din lemn cu o valoare adăugată mai mare, gen mobilă și case de lemn.

Există 17.518 exploatații agricole în teritoriul Valea Muntelui⁴. Din acestea 188 sunt doar cu efective de animale, 4.737 doar cu suprafață agricolă iar restul majoritar de 12.593 exploatații mixte. Urmărind efectivul de animale din exploatații pe categorii de specii se evidențiază în ordine descrescătoare: ovinele cu 28.802 capete, bovinele cu 10.759 capete, porcinele cu 10.080 capete, caprinele cu 4.937 capete și familiile de albine cu 2.639 unități.

Numărul mediu al salariaților la nivelul teritoriului este de 3.218⁵, ceea ce indică o puternică inegalitate față de sectorul populației adulte. Procentual, doar 6,11% din total populației are un loc de muncă, ceea ce raportat la totalul populației adulte arată faptul că doar 9,51%, din populația adultă, au un loc de muncă.

Rata de ocupare a forței de muncă este de 55,6% iar rata șomajului ca medie la nivelul celor 8 localități este de 5,8%, și are în vedere un număr de 1.304 șomeri.

Pe lângă peisajul natural deosebit există și obiective turistice reprezentative în zonă: Castelul Ghika Dofteana, Palatul Știrbei din Dărmănești, Lacul de Acumulare (Barajul) Valea

⁴ Conf. Direcția Județeană de Statistică Bacău, Recensământul General Agricol 2010 și prelucrării datelor INS

⁵ Conf. INS, Anuarul Statistic al județului Bacău ediția 2012

Uzului, Cetatea Rakoczi Ghimeș, Mormântul eroului Emil Rebreanu Palanca, Mănăstirile Diaconești și Cotumba de la Agăș, Schitul Sf Ilie Dărmănești.

OBIECTIVELE ASUMATE ale STRATEGIEI

Un obiectiv în a sprijini constituirea și promovarea unor forme de cooperare a entităților implicate în creșterea valorii adăugate a sectoarelor domeniului privat agricol și neagricol.

Un alt obiectiv asumat este și acela de a fi alături de inițiativele din sfera economică neagricolă, sprijinind inițiativele, ce vor integra soluții inovatoare față de protecția mediului și acțiuni de promovare.

Obiectivul de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurii publice, inclusiv sociale, pentru populația locală, alături de susținerea activităților societății civile și integrarea minorităților locale.

Logica de Intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală conform modificării SDL din 24.08.2018

Obiectiv de dezvoltare rurală 1	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de Intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
Obiective Transversale: Inovare	P1	1C	M12/1C	- Numărul total al participanților instruiți -15
		1B	M2/1B	-Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare - 2 -Cheltuieli publice totale-.200.000 € -Locuri de muncă nou create - 2 -Lanț scurt de aprovizionare - 1 - Formă juridică asociativă nou înființată - 1 - Marcă locală nou creată - 1
	P2	2A	M1/2A	Numărul de exploatații agricole sprijinite: 1 Cheltuieli publice totale: 160,000 € Locuri de muncă nou create - 1

	P3	3A	M3/3A	- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători - 3 -Cheltuieli publice totale - 27.000 €
Obiectiv de dezvoltare rurală 2	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
Obiective Transversale: Inovare și Mediu	P4	4A	M4/4A	-Suprafață totală forestieră (ha) - 100 ha -Cheltuieli publice totale - 5.707 €
			M5/4A	-Suprafață totală forestieră (ha) - 18 ha -Suprafață totală agricolă (ha) - 4 ha -Cheltuieli publice totale - 185.000 €
Obiectiv de dezvoltare rurală 3	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
Obiective Transversale: Inovare, Climă	P6	6A	M6/6A	-Locuri de muncă create - 7 -Cheltuieli publice totale - 300.000 €
			M7/6A	-Locuri de muncă create - 7 -Cheltuieli publice totale - 307.000 €
		6B	M8/6B	-Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită - 3.000 -Cheltuieli publice totale - 611.311€
			M9/6B	-Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită - 80 -Cheltuieli publice totale - 30689 €
			M10/6B	-Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită - 100 -Cheltuieli publice totale - 15.000 €
			M11/6B	-Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită - 500 -Cheltuieli publice totale - 100.000 €

<i>Domenii de intervenție</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de monitorizare</i>
1C	M12	Număr minim de participanți la activitățile proiectului: 15
1B	M2	Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare - 2 Cheltuieli publice totale - 200.000 € Locuri de muncă nou create - 2 Lanț scurt de aprovizionare - 1 O formă asociativă nou înființată O marcă locală nou creată
2A	M1	Cheltuieli publice totale - 160.000 € Nr exploatații sprijinite: 1 Locuri de muncă: 1
3A	M3	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători - 3 Cheltuieli publice totale - 27.000 €
4A	M4	Suprafață totală forestieră (ha) - 100 ha (1km ²) Cheltuieli publice totale - 5.707 €
	M5	Suprafață totală forestieră (ha) - 18 ha Suprafață totală agricolă (ha) - 4 ha Cheltuieli publice totale - 185.000 €
6A	M6	Locuri de muncă create - 7 Cheltuieli publice totale - 300.000 €
	M7	Locuri de muncă create - 7 Cheltuieli publice totale - 307.000 €
6B	M8	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite - 3.000 Cheltuieli publice totale - 611.311 €
	M9	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită - 80 Cheltuieli publice totale - 30.689 €
	M10	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită - 100 Cheltuieli publice totale - 15.000 €
	M11	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite - 500 Cheltuieli publice totale - 100.000 €

Pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor asumați, GAL Valea Muntelui are la dispoziție pentru perioada 07.12.2016 - 31.2.2023 un buget de funcționare în valoare de 621.336,86 euro în baza unui Acord de finanțare asigurat de AFIR prin sM 19.4, ce este împărțit în 3 Contracte de finanțare subsecvente.

Activitățile ce vor fi desfășurate în baza acestui Acord constau în:

1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție
2. Pregătirea și lansarea apelurilor de selecție
3. Animarea teritoriului
4. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor
5. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei
6. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate
7. Monitorizarea proiectelor contractate
8. Întocmirea dosarelor de achiziții și a cererilor de plată, aferente costurilor de funcționare și animare
9. Instruirea și dezvoltarea competențelor angajaților GAL
10. Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL
11. Participarea la activitățile RNDR și cele ale rețelelor europene
12. Actualizarea și întreținerea paginii web

4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII

Scopul evaluării reprezintă analiza intensă pentru o perioadă determinată, care examinează printr-o manieră sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța și succesul strategiei de dezvoltare locală.

Obiectivul principal al evaluării este obținerea informațiilor privind aspectele care funcționează și care nu funcționează, aflarea motivelor pentru care se întâmplă acest lucru și furnizarea recomandărilor necesare îmbunătățirii implementării și rezultatelor unei intervenții.

Obiectivele evaluării urmăresc:

- ✓ Să raporteze și să demonstreze la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;
- ✓ Să înțeleagă ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL), contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.

Scopul și obiectivele au un rol operativ și sunt necesare pentru:

- a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;
- a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala Strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.

Evaluarea SDL totalizează ansamblul activităților realizate de echipa GAL pentru implementarea acesteia și atingerea obiectivelor propuse. În acest sens se va acorda o atenție deosebită monitorizării constante a stadiului implementării strategiei.

Evaluarea este utilă pentru a reflecta asupra progreselor SDL în atingerea obiectivelor sale și pentru a permite luarea deciziilor strategice în timpul implementării Strategiei (evaluare în curs). Evaluarea în curs poate influența atât domeniul de aplicare al Strategiei, cât și selecția proiectelor, precum și aranjamentele de punere în aplicare a Strategiei.

Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiilor de dezvoltare locală implementate în cadrul LEADER, *Ghidului Operațional privind Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală*, recomandă următoarele teme:

Temele de evaluare, la care se dorește obținerea răspunsurilor sunt următoarele:

- ✓ Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice;
- ✓ Măsura în care o intervenție și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele;
- ✓ Cât de eficient au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor;
- ✓ În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, distinct de alți factori sau alte intervenții care au influențat aceste efecte;
- ✓ Șansele ca rezultatele obținute să fie păstrate sau dezvoltate în viitor;
- ✓ Impactul activităților de animare a teritoriului;
- ✓ Valoarea adăugată LEADER în teritoriu;
- ✓ Contribuția SDL la aria de intervenție 6B.

Raportul de evaluare va fi disponibil următorilor factori interesați:



Comuna Asău, sat Straja, nr. 241, județul Bacău,
cod poștal 607026, Tel./Fax.: 0234 382 091, www.galvaleamuntelui.ro,
office@galvaleamuntelui.ro, galvaleamuntelui@yahoo.com

- ✓ Membrii Adunării Generale ai GAL-ului
- ✓ Consiliul director al GAL
- ✓ Factori interesați locali din afara GAL (parteneri media, administrația publică, societatea civilă)
- ✓ Publicul larg
- ✓ Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
- ✓ RNDR
- ✓ Alte GAL-uri, FNGAL.

Pentru a fi utilă, evaluarea trebuie percepută, la nivelul GAL, ca o componentă importantă a etapei de implementare a strategiei de dezvoltare locală. Astfel, este oportun să se stabilească încă de la început abordarea evaluării strategiei de dezvoltare locală și, pe cât de detaliat posibil, principalele activități de evaluare. În acest scop s-a desfășurat activitatea de planificare a evaluării, care a:

- identificat temele care se intenționează a fi evaluate, clarificând totodată obiectivele și scopul evaluării;
- definit modul general de lucru, responsabilitățile privind procesul de evaluare, calendarul de lucru și modalitățile de selectare a evaluatorilor (interni, externi sau în combinație);
- furnizat tuturor persoanelor implicate în pregătirea sau aprobarea planului de evaluare (membrii Consiliului Director sau ai Comitetului de Coordonare a Evaluării, responsabili cu evaluarea din cadrul GAL) o perspectivă de ansamblu privind evaluarea care se va desfășura.

Raportul de evaluare va fi prezentat în ședința Consiliului Director. De asemenea, acesta va fi analizat de echipa operațională a GAL, pentru a lua măsurile de corecție acolo unde acest lucru se impune.

5. METODOLOGIA DE EVALUARE

Ghidului Operațional privind Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală recomandă triangularea surselor de date și a metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate pentru a asigura o analiza riguroasă. Așadar, au fost folosite 3 surse relevante, potrivite pentru a furniza informații utile în vederea unei evaluări eficiente. Celor trei surse, grupuri



Comuna Asău, sat Straja, nr. 241, județul Bacău,
cod poștal 607026, Tel./Fax.: 0234 382 091, www.galvaleamuntelui.ro,
office@galvaleamuntelui.ro, galvaleamuntelui@yahoo.com

țință, li s-au aplicat 2 metode de culegere a informațiilor personalizate în funcție de specificul grupului și a aspectului abordat.

Pentru o abordare corectă s-a avut în vedere Logica de intervenție (varianta finală) ce a stat la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală, aceasta indicându-ne atât intențiile și direcțiile privind domeniile de dezvoltare a teritoriului cât și indicatorii de monitorizare, putând astfel structura un instrument de cercetare adecvat pentru determinarea ratei de succes a implementării.

În privința Evaluării implementării SDL, colectarea de date utile din mediul extern a fost orientată către:

1. Beneficiarii proiectelor (mediu extern principal)
2. Beneficiarii evenimentelor locale organizate/co-organizate de GAL (mediu extern principal)
3. Persoane din teritoriul GAL interesate de activitățile GAL (mediu extern secundar)

Pentru mediul public extern au fost elaborate două chestionare, unul cu două întrebări de evaluare și 8 criterii de apreciere, și unul cu o întrebare și 11 criterii de apreciere, fiecare criteriu având câte 3 variante de apreciere, asigurând astfel realizarea unui **sondaj de opinie** pragmatic, simplu dar eficient, focusat pe obiectivul obținerii de date clare utile analizei. Totodată a folosită și metoda calitativă a **observației**, prin care echipa de implementare a colectat informații de la fața locului de la unii beneficiari GAL, întocmind o fișă de constatare în acest scop.

Chestionarele au fost împărțite în două categorii, pentru două tipuri diferite de public:

- Mediu extern primar - beneficiarii proiectelor și cei ai evenimentelor locale
- Mediu extern secundar - persoane din teritoriului GAL (interesate de activitățile GAL)

Echipa de implementare, componentă a mediului public intern, a realizat partea de **studiu a documentelor**, **analiza datelor administrative**, autoevaluarea documentelor fizice rezultate ca urmare a activității GAL întreprinse de la aprobarea SDL până la momentul de referință stabilit de către AM-PNDR, respectiv **01.10.2018**. Astfel, parte a mediului intern al GAL (resurse umane, echipa de implementare) a evaluat partea de documente în vederea analizării stării actuale a GAL și a progresului obținut în urma implementării SDL.

În conceperea întrebărilor din chestionar am considerat importante următoarele:

- coerența și logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală
- măsura în care a contribuit proiectul la îmbunătățirea competitivității firmei

- beneficiile obținute datorită existenței GAL-ului (implicit a metodei LEADER)
- care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute
- măsura în care a sprijinit SDL dezvoltarea beneficiarilor
- importanța și eficiența activității GAL în teritoriu
- transparența și profesionalismul angajaților GAL, cât și vizibilitatea evenimentelor

Chestionarele au fost efectuate direct prin tehnica față în față, realizându-se întâlniri cu beneficiarii. Dat fiind faptul că până la data de 01.10.2018 au fost eligibile și selectate **17 proiecte** la nivel de AFIR, am chestionat **22 de persoane**, dintre care câteva fiind reprezentanții aceluiași beneficiar.

Pentru partea de promovare și vizibilitate au fost chestionate **48 de persoane**, locuitori din teritoriul GAL și participanți în marea lor majoritate la evenimentele organizate de GAL.

Metodă	Instrument de lucru	Sursa datelor	Limitări /constrângeri / măsuri de atenuare	Întrebări de evaluare
Studiul documentelor, Analiza datelor administrative	Formular de analiză	Date secundare	Nu a fost cazul.	Pe baza documentelor de lucru existente la nivelul GAL-ului, s-au analizat: - Raportările de activitate; - Procese verbale ale întâlnirilor; - Proceduri de lucru; - Rapoarte de selecție; - Logica intervenției SDL; - SDL cu anexe. S-a urmărit: - Gradul de atingere a obiectivelor la nivel de măsuri; - Eficiența utilizării resurselor; - Eficacitatea utilizării resurselor. - Gradul de atingere a

				indicatorilor financiar, de realizare și de rezultat
Sondajul de opinie	Chestionar	Date primare	Nu a fost cazul.	Sondajul de opinie a fost realizat la nivelul teritoriului urmărindu-se: - Gradul de mulțumire față de imagine; - Gradul de informare față de stadiu implementare; - Propunerile de îmbunătățire funcționare GAL; - Realizările și neajunsurile la nivelul SDL și activității GAL. Au fost chestionați subiecți din toate cele 8 UAT-uri din rândul beneficiarilor și locuitorilor. Chestionarul a fost aplicat față în față. Eșantionul a cuprins în final 48 de subiecți.
Observația	Fișă de constatare	Date primare și secundare	Proiectele cu sprijin forfetar s-au bucurat de o procedură ceva mai facilă, ceea ce a permis realizarea integrală sau a unor activități de către beneficiari. Angajații GAL trebuie să	Urmărind îndeplinirea acțiunilor asumate în cadrul capitolul IX al SDL <i>Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei</i>, au fost elaborate și aplicate Proceduri de lucru în vederea evaluării și monitorizării activităților beneficiarilor GAL.⁶

⁶ <http://www.galvalemuntelui.ro/sesiuni-proiecte/proceduri-de-lucru.html>

			urmărească periodic stadiul proiectelor.	
--	--	--	--	--

6. CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII

De la data semnării Acordului de finanțare și totodată a Contractului de finanțare subsecvent nr. 1, 07.12.2016, GAL Valea Muntelui a început efectiv activitatea de implementare a SDL, un avantaj major fiind menținerea personalului din cadrul Aparatului Tehnic în aceeași formulă ce a realizat implementarea SDL 2007 - 2013.

Activitatea a fost de asemena susținută de baza materială achiziționată în SDL precedent, însă a cunoscut un blocaj de aproximativ 6 luni, ca urmare a neclarităților administrative de la nivel national, privind furnizarea de documente de lucru tipizate către GAL-uri.

Cu toate acestea, până la finalul lunii august 2017 au fost efectuate/avizate majoritatea achizițiilor necesare desfășurării activităților etapei I din perioada 2014-2020. Evidența realizării este aceasta:

Nr. crt	Denumire achizitie	CAP. Buget	Cod CPV	Formular D 0.1L- Fundamente necesitati i cumparari directe	Formular D1L- Raport de verificare OJFIR BACAU privind fundamentele necesitatii cumparari i directe	Denumire contract achizitie directa	Fisa naveta transmitere documentatie achizitie directa	Fisa naveta raspuns CRFIR IASI documentatie achizitie directa	Clarificari	Valoare achizitie fara TVA
1	ACHIZIȚIA SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA	II	7921210 0-4	32/10.01.2 017	AVIZARE 244/26.01.2 017	Contract servicii auditare financiara Nr.33 din 30.01.2017 inregistrata GAL 83 din 30.01.2017	77/30.01.2 017	AVIZARE 270/06.02. 2017 271/06.02. 2017		45,000 .00 lei
2	ACHIZIȚIA SERVICII DE CONTABILITATE	II	7921100 0-6	28/10.01.2 017	AVIZARE 245/26.01.2 017	Contract de prestari servicii privind VERIFICAREA CONTABILITATII, INTOCMIREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE SI A DECLARATIILOR FISCALE Nr.1/01.02.2017 inregistrat la GAL Nr.92/01.02.2017	93/01.02.2 017	AVIZARE 296/07.02. 2017 297/07.02. 2017	ACT ADITIONAL NR.1 /07.02.2017 - specificare valabilitate contract	10,800 .00 lei

3	ACHIZIȚIA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT/AUTOTURISM	III	3411000 0-1	5/ 21.12.2016	AVIZARE 26/05.01.2017	Model Contract vanzare-cumparare Nr. 11.07.2017	40/11.01.2017	NEAVIZARE 87/17.01.2017	Beneficiarul nu a finalizat procedura de achiziție în sensul că nu s-au transmis notificările de acceptare și implicit nu s-a semnat contractul de furnizare. Redă punerea documentației complete.	19.921,85 euro
4	ACHIZIȚIA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT/AUTOTURISM	III	3411000 0-1	5/ 21.12.2016	AVIZARE 26/05.01.2017	Contract vanzare-cumparare Nr. 204 din 18.01.2017 înregistrat la GAL Nr.47 din 18.01.2017	49/18.01.2017	AVIZARE 140/20.01.2017 141/20.01.2017		81,000 .00 lei
5	ACHIZIȚIA PRODUSE, ACCESORII BIROU, CONSUMABILE BIROTICĂ ȘI PAPETARIE	III	3019270 0-8, 3019000 0-7	20/10.01.2017	AVIZARE 258/27.02.2017	Contract furnizare consumabile birotică și papetarie Nr.02 din 30.01.2017 înregistrat la GAL Nr.74 din 30.01.2017	75/30.01.2017	AVIZARE 274/06.02.2017 275/06.02.2017		5,699.98 lei
6	ACHIZIȚIA SERVICII, MENȚENENȚĂ/REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE COPIATOARE	III	5031310 0-3 5031320 0-4	17/10.01.2017	AVIZARE 339/02.02.2017	Contract de prestări servicii mentenanță /reparare și întreținere copiatoare Nr.2 din 07.02.2017- înregistrat la GAL Nr.105 din 07.02.2017	106/07.02.2017	AVIZARE 500/16.02.2017 501/16.02.2017		8,750.00 lei
7	ACHIZIȚIA PIESE, CONSUMABILE, ACCESORII ȘI TONERE PENTRU FOTOCOPIATOARE	III	3012500 0-1, 3012512 0-8	12/10.01.2017	AVIZARE 341/02.02.2017	Contract de furnizare piese, consumabile, accesorii și tonere pentru fotocopioare Nr.3 din 07.02.2017- înregistrat la GAL Nr.99/07.02.2017	100/07.02.2017	AVIZARE 498/16.02.2017 499/16.02.2017		14,491 .00 lei
8	ACHIZIȚIA DE PRODUSE IT-PIESE, ACCESORII, ECHIPAMENTE CALCULATOARE ȘI LAPTOP-URI	III	3023710 0-0, 3023700 0-9, 3023720 0-1, 3023730 0-2, 4882000 0-2, 3023310 0-2, 3023132 -5, 3242000 0-3, 32422000-7, 325811100-0, 4531432 0-0, 3023741 0-6, 3023746	136/28.02.2017	NEAVIZARE 753/16.03.2017					9,802.00 lei

			0-1						
9	ACHIZITIA DE SERVICII MENTENANTA/REPARARE SI INTRETINERE ECHIPAMENTE IT SI SERVER	III	5031200 0-5	140/28.02. 2017	NEAVIZARE 754/16.03.2 017				21,100 .00 lei
10	ACHIZITIA DE PRODUSE IT - PIESE, ACCESORII, ECHIPAMENTE CALCULATOARE si LAPTOP-URI ACCESORII MODERNIZARE RETEA/INSTALARE E RETEA PRIN CABLU SI ACHIZITIONARE SI INSTALARE SERVER	III	3020000 0-1, 3023710 0-0, 3023700 0-9, 3023720 0-1, 3023730 0-2, 4882000 0-2, 3023310 0-2, 3023132 -5, 3242000 0-3, 3242200 0-7, 3258111 00-0, 4531432 0-0, 3023741 0-6, 3023746 0-1	147/29.06. 2017	AVIZARE 1833/18.07. 2017	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE IT - PIESE, ACCESORII, ECHIPAMENTE CALCULATOARE SI LAPTOP-URI, ACCESORII MODERNIZARE RETEA/INSTALARE E RETEA PRIN CABLU SI ACHIZITIONAREA SI INSTALARE SERVER Nr.67/28.07.2018 - inregistrat la GAL 168/28.07.2017	169/28.07. 2017	AVIZARE 3268/10.08 .2017 3269/10.08 .2017	7,283. 23 lei
11	ACHIZITIYA SERVICII MENTENANTA si REPARARE ECHIPAMENTE IT, SERVER si RETEA LAN	III	5031200 0 - 5	151/29.06. 2017	AVIZARE 1832/18.07. 2017	CONTRACT DE PRESTARI SERVICII SERVICII MENTENANTA si REPARARE ECHIPAMENTE IT-PC-uri, LAPTOP-uri, SERVER si RETEA LAN Nr. 85 /26.07.2017- inregistrat la GAL Nr.161/26.07.2017	162/26.07. 2017	AVIZARE 3266/10.08 .2017 3267/10.08 .2017	14,570 .00 lei

12	ACHIZIȚIA SERVICII ACTUALIZARE LUNARA, IMBUNATĂȚIRE WEBSITE	V	7241300 0-8	24/10.01.2 017	AVIZARE 259/27.01.2 017	Contract de prestări servicii actualizare lunara, imbunatatire website Nr 73/31.01.2017- inregistrat la GAL Nr.86/31.01.2017	87/31.01.2 017	AVIZARE 272/06.02. 2017 273/06.02. 2017		11,830 .00 lei
13	ACHIZIȚIA PRODUSE/BUNU RI -MATERIALE DE ANIMARE, MATERIALE PROMOTIONALE, ARTICOLE VESTIMENTARE PERSONALIZATE SI PLACUTE INFORMATIVE PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENȚEI	V	2246200 0-6	43/13.01.2 017	AVIZARE 355/03.02.2 017	Contract furnizare produse/bunuri materiale de animare , materialepromoti onale, articole vestimentare personalizate si placute informative pentru asigurarea transparenței Nr.06/07.02.2017 -inregistrat la GAL 112 din 07.02.2017	113/07.02. 2017	NEAVIZARE 497/16.02. 2017	nu au fost eligibile cele 3 perechi de cizme si 5 tricouri din cele 10 prinse in contract	9,052. 00 lei
14	ACHIZIȚIA PRODUSE/BUNU RI -MATERIALE DE ANIMARE, MATERIALE PROMOTIONALE, ARTICOLE VESTIMENTARE PERSONALIZATE SI PLACUTE INFORMATIVE PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENȚEI	V	2246200 0-6	43/13.01.2 017	AVIZARE 355/03.02.2 017	Contract furnizare produse/bunuri materiale de animare , materialepromoti onale, articole vestimentare personalizate si placute informative pentru asigurarea transparenței Nr.06/07.02.2017 -inregistrat la GAL 112 din 07.02.2017	113/07.02. 2017	AVIZARE 700/02.03. 2017 701/02.03. 2017	Act aditional Nr.1/17.02.201 7- fara 3 perechi de cizme si 5 tricouri din cele 10 prinse in contract	8,602. 00 lei
15	SERVICII SPOTURI, COMUNICATE DE PRESĂ, ANUNT ZIAR SERVICII DE PUBLICITATE	V	7934100 0-6	60/27.01.2 017	AVIZARE 491/17.02.2 017	Contract prestări servicii SPOTURI, COMUNICATE DE PRESĂ, ANUNT ZIAR CONTRACT DE PUBLICITATE Nr.14/21.02.201 - inregistrat la GAL 127/21.02.2017	125/21.02. 2017	AVIZARE 785/ 07.03.2017 786/07.03. 2017		5,662. 80 lei
16	ACHIZITIA SERVICII DE MASA PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE ANIMARE	V	5530000 0-3	57/27.01.2 017	AVIZARE 497/17.02.2 017	Contract PRESTARI SERVICII DE RESTAURANT SI SERVIRE A MANCARI Nr.4/22.02.2017 -inregistrat la GAL Nr.132/22.02.201 7	133/22.02. 2017	NEAVIZARE 784/07.03. 2017	nu are caracter rezonabil pretul de 82,57 lei/persoana	7,431. 30 lei

17	ACHIZIȚIA PRODUSE/BUNURI - CORT EXPOZIȚIONAL DEMONTABIL, PERSONALIZAT	V	3952253 0-1	154/25.07. 2017	AVIZARE 2081/04.08. 2017	CONTRACT PENTRU ACHIZITIONARE DE PRODUSE- CORTURI Nr. 10 din data de 11.08.2017- inregistrat la GAL Nr.181/11.08.201 7	182/16.08. 2018	AVIZARE 3444/23.08 .2017 3445/23.08 .2017		8,114. 24 lei
18	ACHIZIȚIA PRODUSE/BUNURI - MOBILIER PENTRU ACTIVITATI DE PROMOVARE/INF ORMARE- MESE SI SCAUNE	V	3910000 0-3	174/03.08. 2017	AVIZARE 2413/29.08. 2014	CONTRACT PENTRU ACHIZITIONARE DE PRODUSE MOBILIER PENTRU ACTIVITATI DE PROMOVARE/INF ORMARE- MESE SI SCAUNE Nr. 1 din data de 04.09.2017- inregistrat la GAL Nr.197/04.09.201 7	198/04.09. 2017	AVIZAT		5,422. 00 lei
19	ACHIZITIA SERVICII DE MASA PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE ANIMARE CAPITOLUL V	V	5552000 0-1	185/16.08. 2017	AVIZARE 2417/29.08. 2017	CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 32 din 08.09.2017- inregistrat la GAL Nr.203/08.09.201 7	204/08.09. 2017	AVIZAT		2,880. 00 lei

Avizările achizițiilor au permis desfășurarea activităților în conformitate cu Calendarul Activităților.

Au fost elaborate documentele aferente lansării Măsurilor de finanțare și în acest fel până la data de 01.10.2018 au fost deschise 3 Apeluri de selecție pentru următoarele măsuri și în următoarele perioade:

Nr. Crt	Nr. Sesiune	Măsura	Perioada	Alocare publica
1	1 din 2017	M1 - CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE DE COOPERARE	5 iulie - 4 august 2017	51.199,22 Euro
2		M5/4A INFRASTRUCTURĂ DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR	5 iulie - 4 august 2017	236.796,40 Euro


3		MĂSURA 6/6A ÎNFIINȚAREA DE NOI ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE	5 iulie - 4 august 2017 prelungire până pe 18 august 2017	383.994,17 Euro
4		Total M7 - "DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NEAGRICOLE EXISTENTE"	5 iulie - 4 august 2017	192.954,02 Euro
5		M8 /6B - "INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII	5 iulie - 4 august 2017	522.790,34 Euro
6		M9/6B - "INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ"	5 iulie - 4 august 2017 prelungire până pe 18 august 2017	111.358,31 Euro
7		M10/6B - "SPRIJIN PENTRU INTEGRAREA MINORITĂȚILOR	5 iulie - 4 august 2017 prelungire până pe 18 august 2017	19.199,71 Euro
1	2 din 2017	M5/4A INFRASTRUCTURĂ DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR	28 decembrie 2017 - 8 februarie 2018	127.390,40 Euro
2		MĂSURA 6/6A ÎNFIINȚAREA DE NOI ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE	28 decembrie 2017 - 8 februarie 2018	103.994,17 Euro suplimentat la 120.000 Euro *
3		M8 /6B - "INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII	28 decembrie 2017 - 8 februarie 2018	381.460,34 Euro
1	1 din 2018	M7 - "DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NEAGRICOLE EXISTENTE"	4 aprilie - 11 mai 2018 prelungire până pe 21 mai 2018	392.954,02 Euro
2		Măsura 11/6B „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII CIVILE”	4 aprilie - 11 mai 2018	185.597,18 Euro

Măsurile 1, 2, 3, 4 și 12 urmează a fi deschise în perioada martie-mai 2019. Acestea sunt aferente Art.35 și au avut parte de câteva neclarități privind modul de lucru. Apoi măsura privind schemele de calitate a fost gândită să poată oferi un sprijin complementar beneficiarilor de proiecte aferente M1 și M2 ce-și propun susținerea formelor asociative în agricultură, în vederea procesării materiei prime locale. Astfel M3 urmează a fi lansată după selecția proiectelor de pe M1 și M2.

Măsura 4, dedicată promovării zonelor Natura2000, a devenit imposibil de implemetat datorită OUG 75/19.07.2018 prin care este eliminată noțiunea de custode al acestor zone, urmând să fie administrate de Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate (ANANP). La momentul scrierii și aprobării SDL, pe teritoriul GAL existau custozi privați pentru siturile Natura2000.



Măsura 12 este o măsură nou introdusă în luna august 2018 și își propune realizarea unei instruiți în domeniul promovării și a marketingului pentru minim 15 beneficiari de proiecte. Cum Măsura 7, dedicate activităților economice nonagricole și M1 și M2 pentru partea economică agricolă nu au fost încă epuizate, se amână deschiderea măsurii până la selecția finală a proiectelor ce vor acoperi sumele disponibile pe cele 3 măsuri.

Apelurile de Selecție cât și Rapoartele de Selecție au fost publicate pe pagina de internet - www.galvalemuntelui.ro - cât și la sediul GAL.

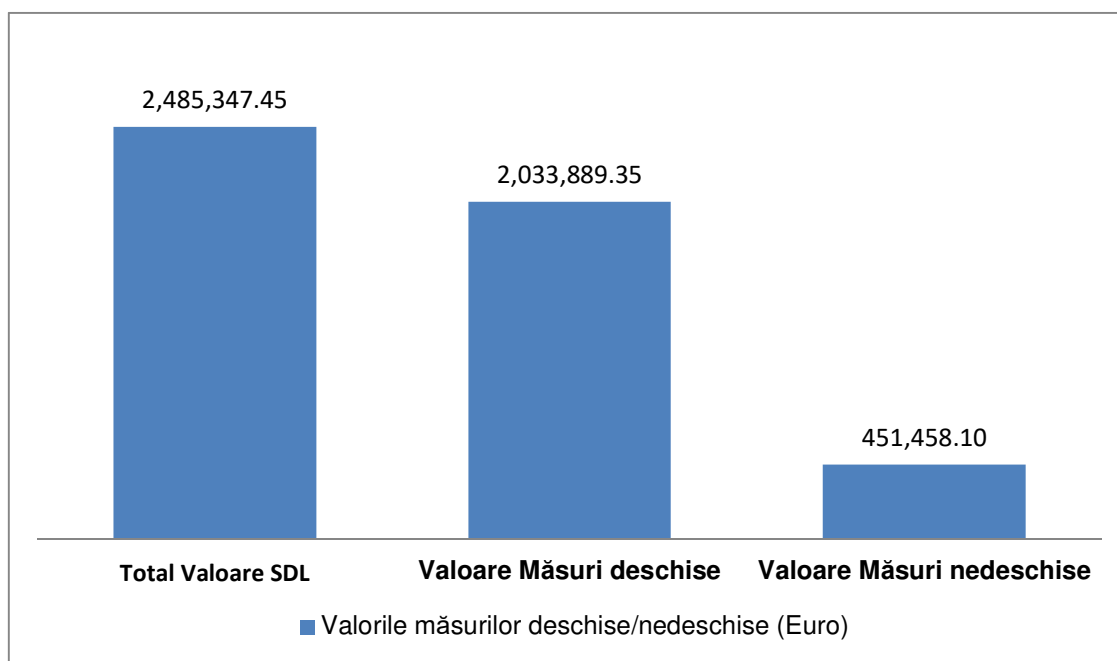

Raportându-ne la valoarea totală disponibilă a SDL, măsurile GAL Valea Muntelui rămase a fi deschise reprezintă un procent de **18,16%**.

6.1 Situația pe măsurile SDL la 01.10.2018, sM 19.2

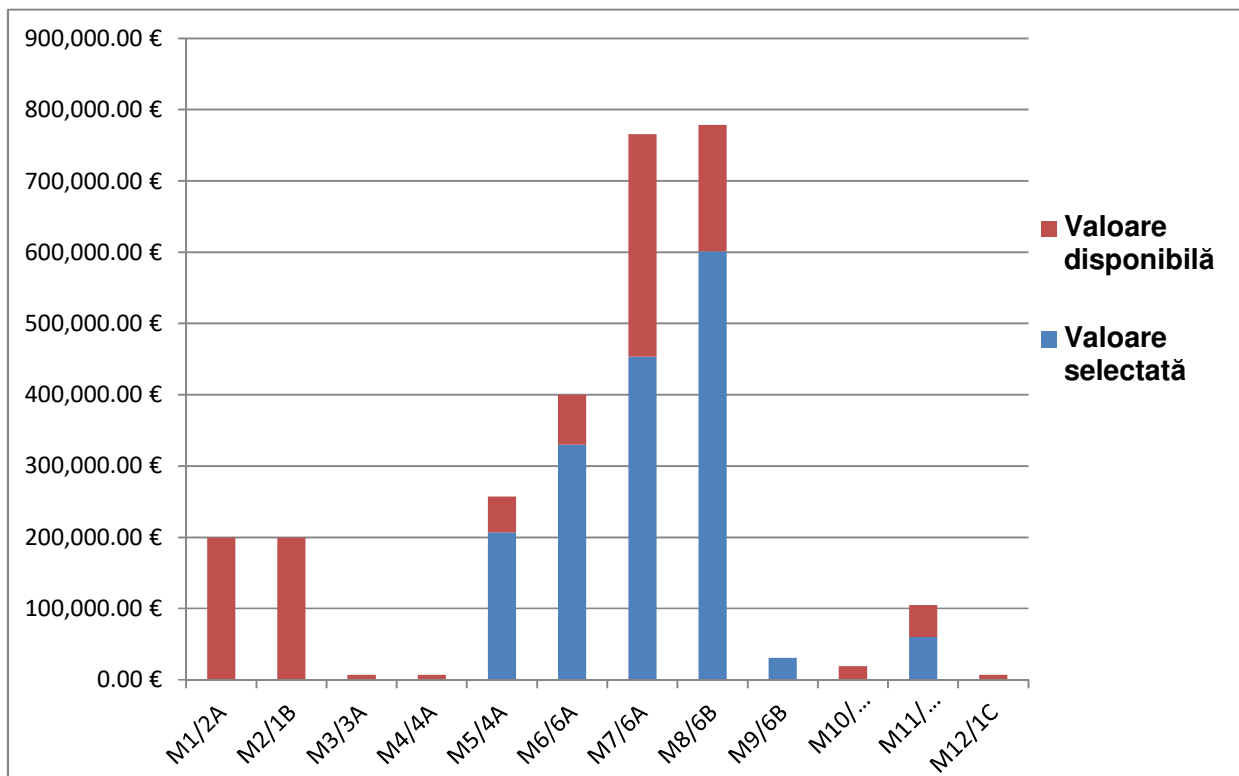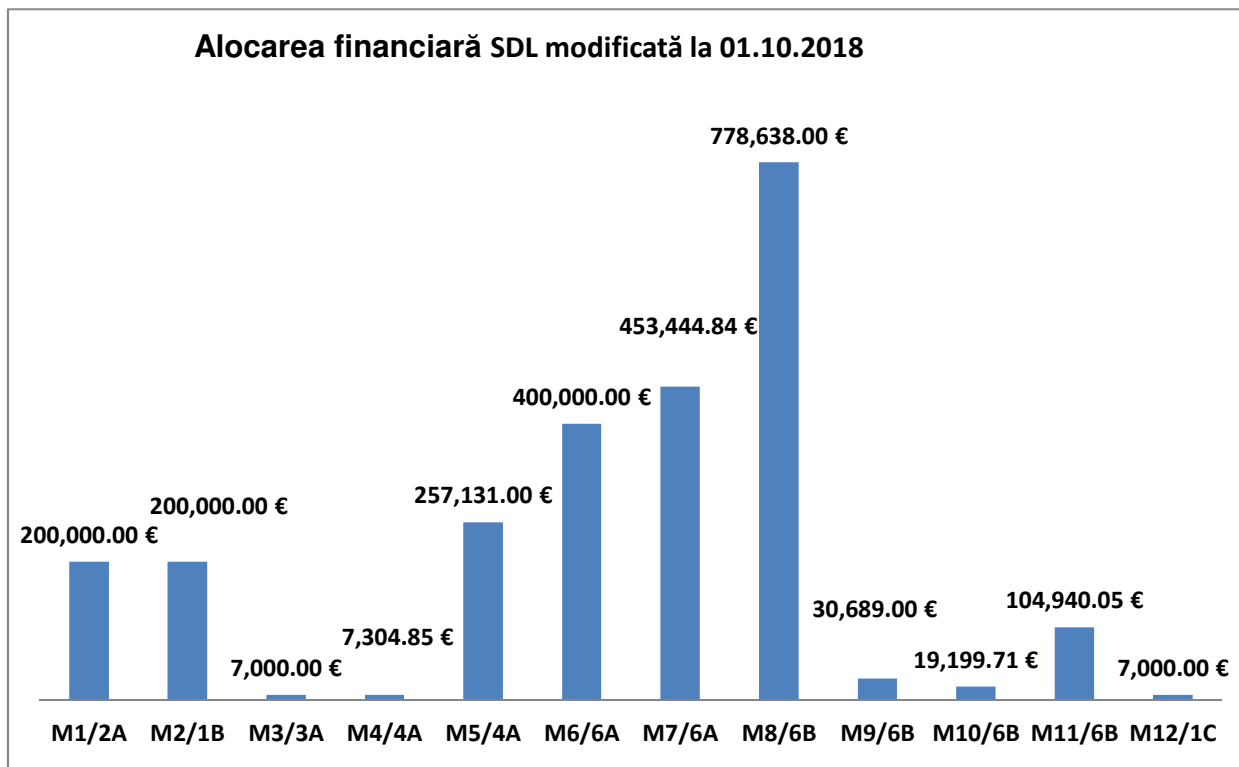

M1/2A - Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole

Valoare alocată măsurii 200.000€.

Valoare selectată 0€

Valoare disponibilă 200.000€

Măsura a făcut obiectul a două modificări complexe de SDL.


Inițial la 23.06.2016 avea titulatura: *M1/1A - Constituirea și promovarea formelor asociative de cooperare*

Alocare inițială - 51.199,22 €

A fost lansată în perioada 5 iulie - 4 august 2017 și a fost selectat la GAL un proiect în valoare de 25.600€, proiect declarat neeligibil la OJFIR.

Prima modificare de SDL din 14.06.2017 a vizat completarea Condițiilor de eligibilitate și corelarea Sumelor aplicabile și rata sprijinului cu valoarea din unitățile de bonusare.

A doua modificare de SDL din 24.08.2018 a readaptat și modificat complet forma inițială, de la Art. 35, către Art. 17, păstrându-i destinația de măsură de sprijin pentru activități agricole. I-a fost suplimentată suma disponibilă la 200.000€ conform schemei de la pagina 9.

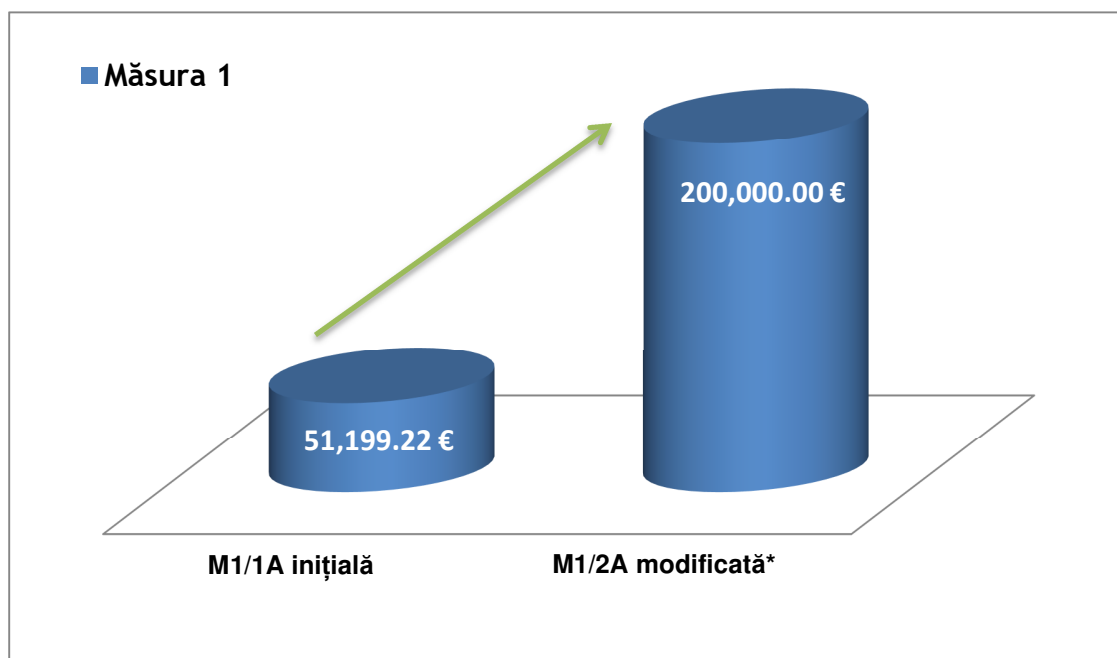

*)Măsura urmează să fie lansată în perioada martie - aprilie 2019.

M2/1B - Cooperare pentru dezvoltarea și promovarea lanțurilor scurte și a piețelor locale

Valoare alocată măsurii 200.000€.

Valoare selectată 0€

Valoare disponibilă 200.000€


Măsura a făcut obiectul a două modificări complexe de SDL.

Inițial la **23.06.2016** avea o alocare de 403,193.87€.

Prima modificare de SDL din **14.06.2017** a vizat corelarea Sumelor aplicabile și rata sprijinului cu valoarea din unitățile de bonusare.

Datorită clarificărilor date de AFIR pentru implementarea măsurilor ce țin de Art.35

A doua modificare de SDL din **24.08.2018** a readaptat și modificat forma inițială către sprijinirea unor proiecte inovatoare de către Grupuri Operaționale. Valoarea disponibilă a fost diminuată la 200.000€, conform schemei de la pagina 9.

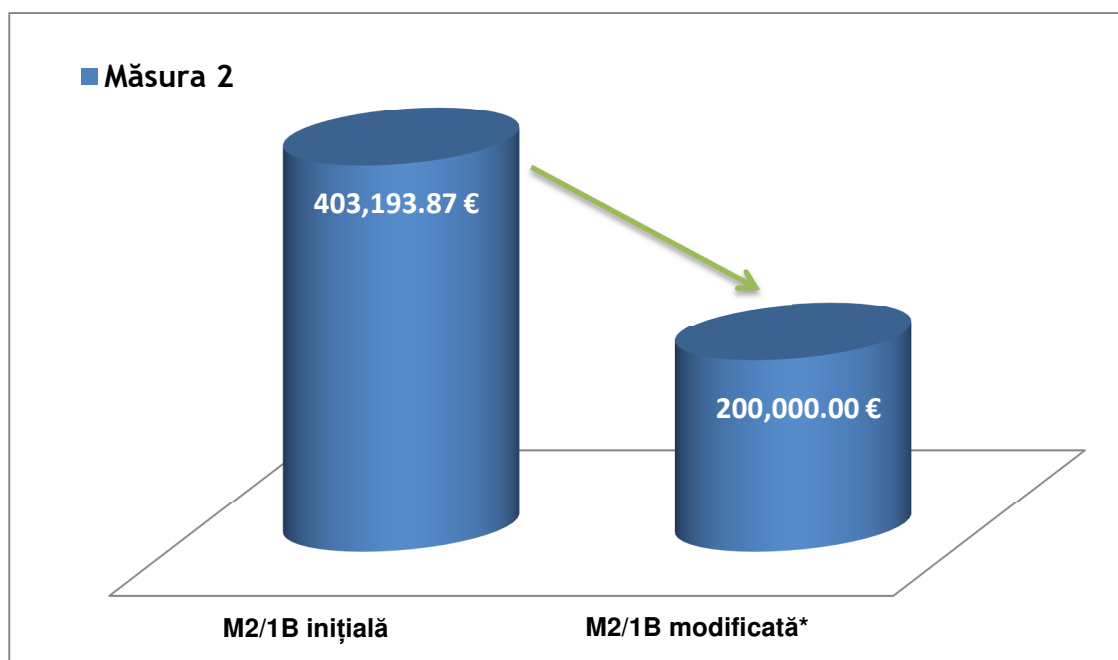

*) Măsura urmează să fie lansată în perioada martie - aprilie 2019.

M3/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare


Valoare alocată măsurii 27.000€.

Valoare selectată 0€

Valoare disponibilă 27.000€

La **23.06.2016** avea o alocare inițială de 40,959.38€.

Măsura a făcut obiectul unei modificări complexe de SDL, în **24.08.2018** valoarea disponibilă a fost diminuată la 27.000€, ca urmare a corelării cu sprijinul forfetar din Reg. UE, conform schemei de la pagina 9.

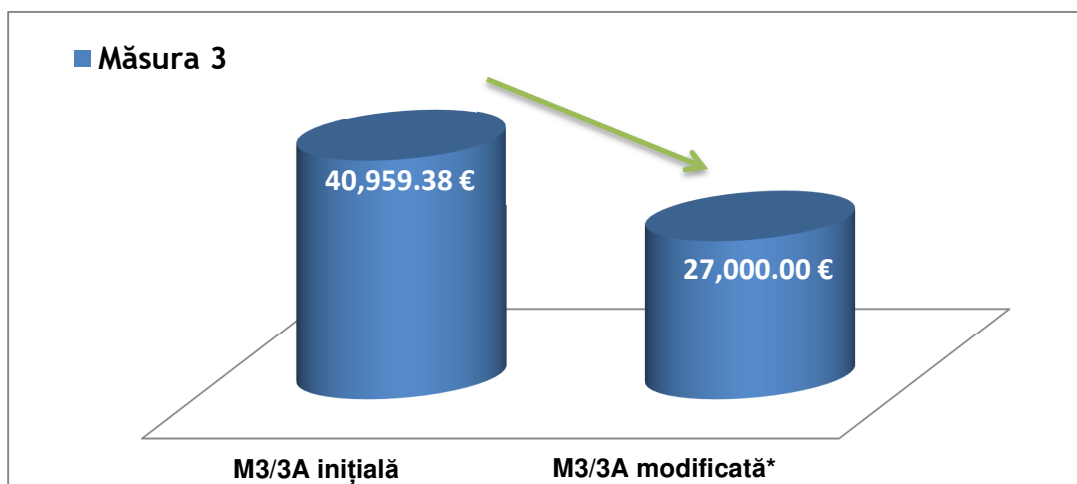

*) Măsura urmează să fie lansată după selecția proiectelor pe M1 și M2

M4/4A - Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000

Valoare alocată măsurii 7,304.85€.

Valoare selectată 0€

Valoare disponibilă 7,304.85€

Măsura nu a fost lansată inițial, fiind planificată a fi lansată pe finalul anului 2018. Între timp ea a devenit imposibil de implementat datorită OUG 75/19.07.2018 prin care este eliminată noțiunea de custode al acestor zone. Zonele Natura2000 vor fi administrate de către agenția nou înființată, Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate (ANANP). La momentul scrierii și aprobării SDL, pe teritoriul GAL existau custozi privați pentru siturile Natura2000.


Măsura urmează a fi lansată în această formă, dacă AM-PNDR va da o soluție favorabilă.

M5/4A - Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor

Valoare alocată măsurii 236,796€, majorată la 257,131€ (24.08.2018)

Valoare selectată 207.130€ și valoare contractată 206.688€ - 2 proiecte.

Valoare disponibilă 50.443€

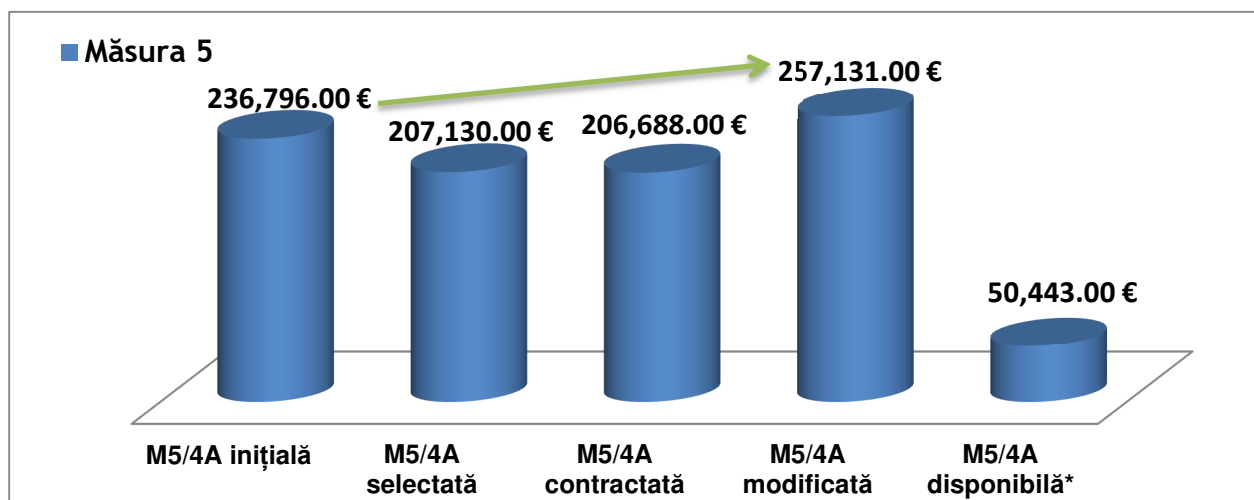


*) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada aprilie-mai 2019

M6/6A - Înfiiințarea de noi activități neagricole

Valoare alocată măsurii 383,994.17€, majorată la 400,000.00€ (24.08.2018)

Valoare selectată 330,000.00€ și valoare contractată 330,000.00€ - 5 proiecte.

Valoare disponibilă 70.000€

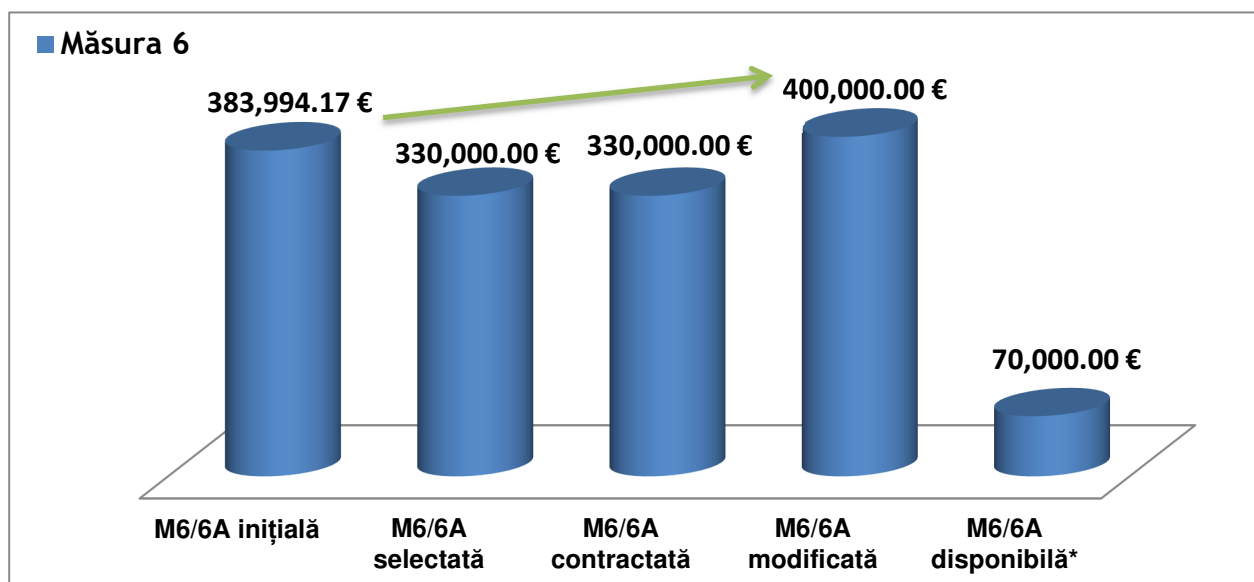


*) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 2019

M7/6A - Dezvoltarea activităților neagricole existente

Valoare alocată măsurii 392,954.02€, majorată la 453,444.84€ (24.08.2018)

Valoare selectată 141,360.00€ și valoare contractată 141,360.00€ - 2 proiecte.

Valoare disponibilă 312,084.00€

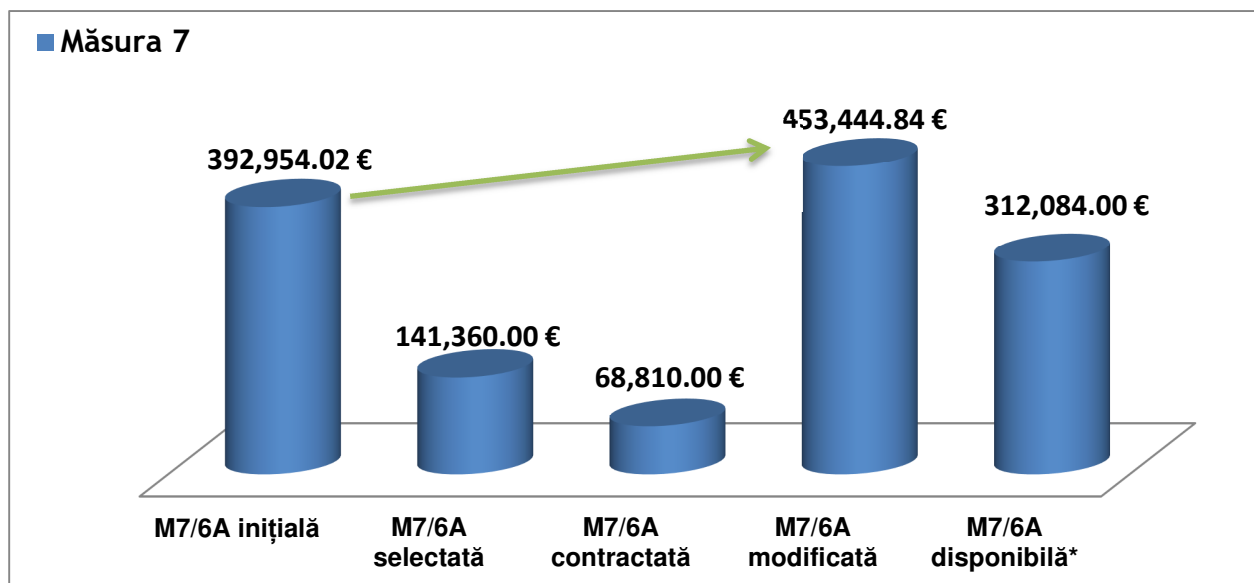


*) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 2019

M8/6B - Investiții în infrastructură și servicii publice

Valoare alocată măsurii 652,790.34€, majorată la 778,638.00€ (24.08.2018)

Valoare selectată 608,638€ și valoare contractată 601,173€ - 5 proiecte.


Valoare disponibilă 177,465.00€

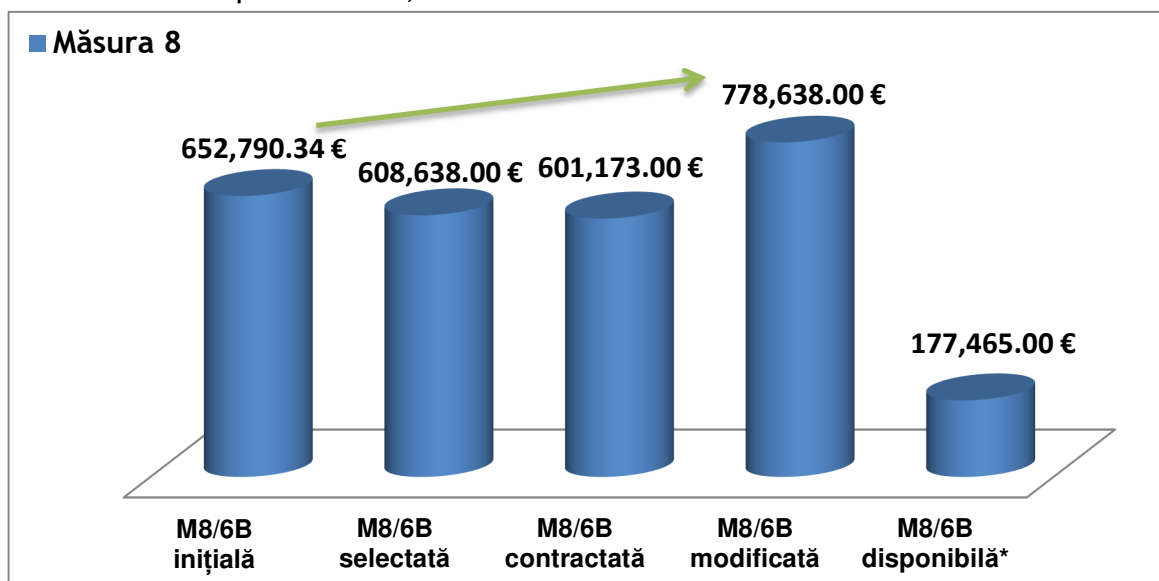

*) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 2019

M9/6B Investiții în infrastructura socială

Valoare alocată măsurii 111,358.31€, diminuată la 30,689.00 € (24.08.2018)
Valoare selectată 30,689.00€ și valoare contractată 30,689.00€ - 1 proiect.
Valoare disponibilă 0.00€, valoarea transferată conform figurii de la pagina 9.

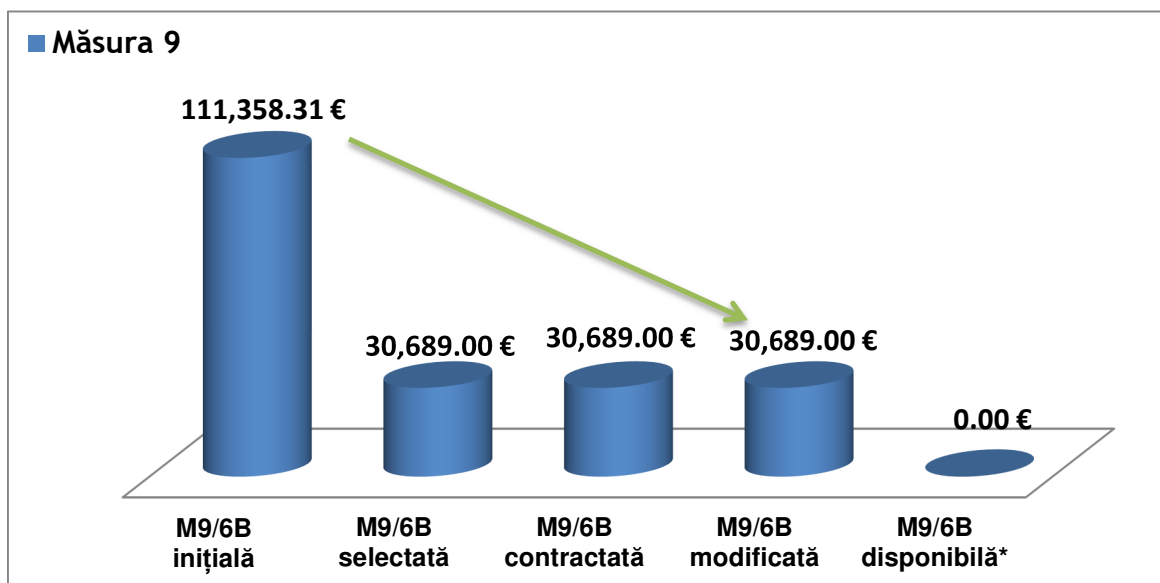


M10/6B - Sprijin pentru integrarea minorităților locale

Valoare alocată măsurii 19.199,71€
Valoare selectată 0,00€ și valoare contractată 0,00€.
Valoare disponibilă 19.199,71€*.

*)Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 2019

M11/6B - Dezvoltarea activității societății civile

Valoare alocată măsurii 185,597.18€, diminuată la 104,940.05€ (24.08.2018)
Valoare selectată 59,940.05€ și valoare contractată 59,940.05€.
Valoare disponibilă 45,000.00€*.

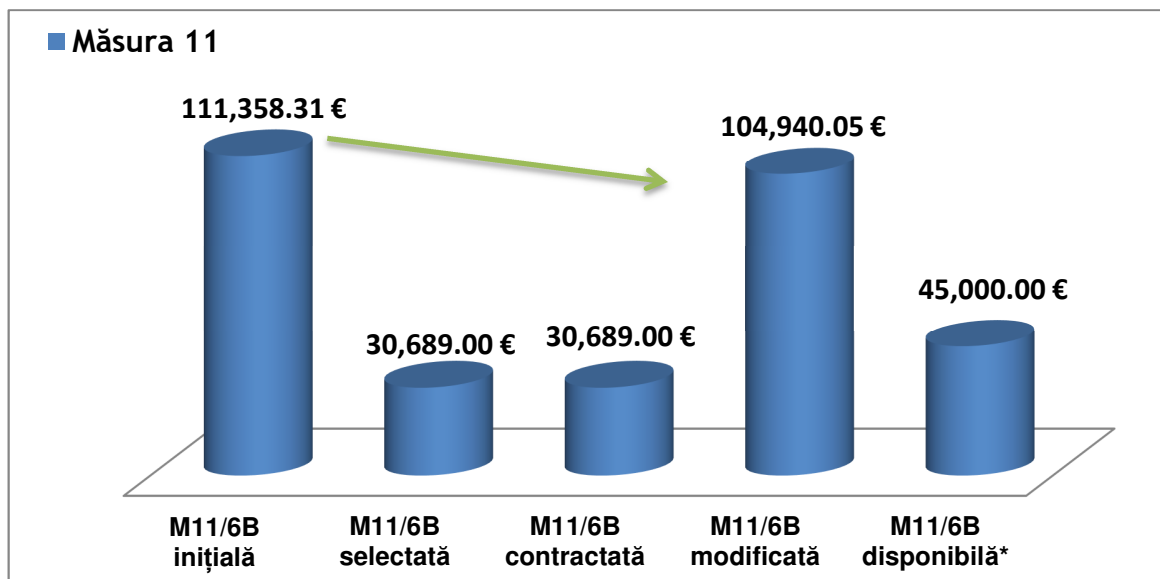

*) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 2019

M12/1C - Sprijin pentru formarea și informarea producătorilor agricoli și agenților economici de pe teritoriul GAL

Măsură de finanțare nou introdusă prin ultima modificare de SDL/24.08.2018.
Valoare alocată măsurii 7,000€.
Valoare selectată 0€ și valoare contractată 0€.
Valoare disponibilă 7,000.00€*.

Măsura urmează a fi lansată după încheierea selecției la nivel AFIR pentru M1, M2, M6 și M7, estimarea fiind pentru luna august 2019.

6.2 Situația sumelor SDL la 01.10.2018, pe sM 19.4 - Funcționarea GAL


Estimarea implementării Contractului de finanțare subsecvent nr.1 a fost făcută pentru solicitarea unui Avans de funcționare în valoare de 1,006,757.00lei și un Modul de 4 Tranșe de plată care să asigure funcționarea pe cei 3 ani, cât și justificarea Avansului.

Au fost depuse și decontate 2 Tranșe de plată în luna Martie 2018:

Tranșa 1 = 35,672.45 lei

Tranșa 2 = 486,248.80 lei

Avansul de 1,006,757.00 lei a fost încasat în luna Decembrie 2016.

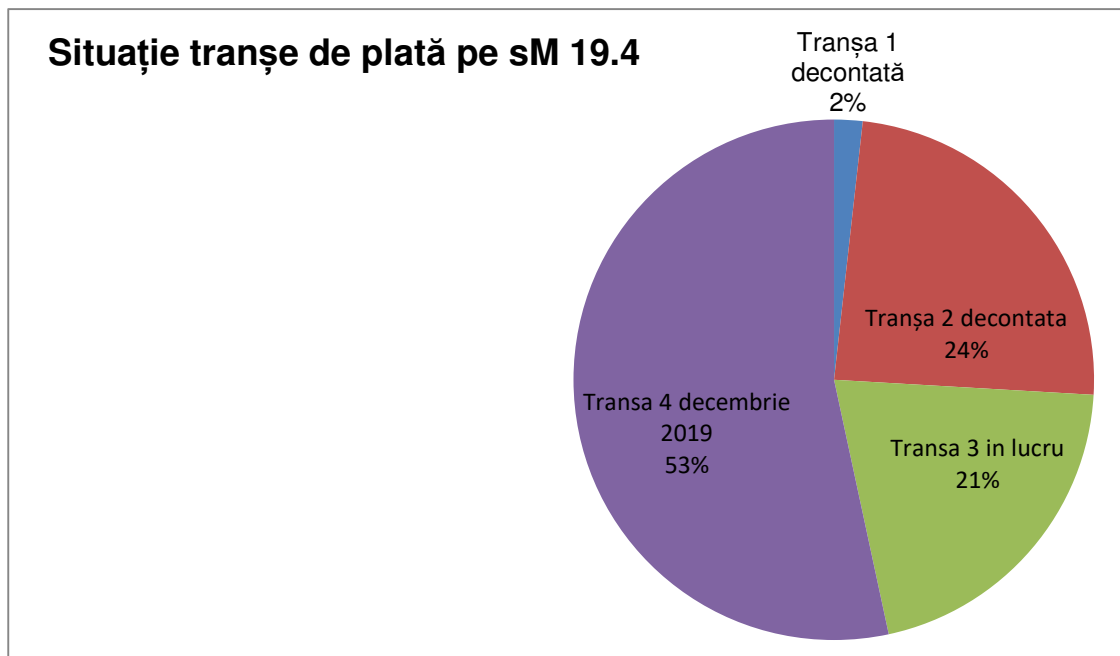

6.3 Centralizarea și rezultatele chestionarelor

La nivelul BENEFICIARILOR a fost aplicat un chestionar la un număr de 22 de persoane. Rezultatul răspunsurilor:

Întrebarea 1.

Având în vedere momentul de la care ați început informarea pentru condițiile de realizare a unui proiect și până la momentul depunerii proiectului efectiv la secretariatul GAL, vă rugăm să ne precizați cum ați relaționat cu angajații GAL în situația:

- Obținerii informațiilor despre măsurile de finanțare?

Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
21	1	-

- Anumitor neclarități legate de documentele de completat și furnizat?

Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
20	2	-

- Descrierii mecanismului privind realizarea și depunerea unui proiect (pașii ce au ținut de pregătirea proiectului: ce fel de documente, specialiști, contribuție proprie, etc... aveți nevoie)?

Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
19	3	-

- Descrierii modului de implementare a unui proiect (ce trebuie să faceți după obținerea finanțării)?

Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
18	3	1

- Planificării unei întâlniri la sediul GAL în timpul sau în afara timpului de lucru?

Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
18	4	-

- Evaluării proiectului depus de dvs. ?


Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
20	2	-

- Furnizării de documente ce țin de GAL, în vederea prezentării la AFIR pentru parcurgerea altor etape (evaluare, contractare, plată)?

Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
19	3	-

- Evenimentelor de informare (întâlniri individuale, de grup/conferințe, la sediul primăriei)

Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
19	3	-

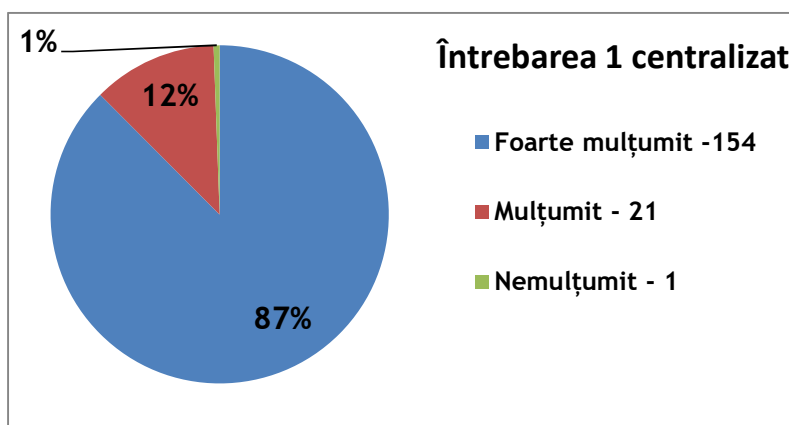

Întrebarea 2:

Pornind de la experiența avută cu GAL-ul, în toate etapele de pregătire a proiectului, vă rugăm să ne spuneți părerea dumneavoastră referitoare la utilitatea și rolul GAL-ului:

- Considerați că existența GAL-ului în zona dvs. a fost/este benefică ?

Cu siguranță da	Așa și așa	Mă descurcam și fără	Sigur nu
22	-	-	-

- V-ați descurca la fel în obținerea finanțării făcând aplicația cu proiectul dvs. la nivel național?

Cu siguranță da	Așa și așa	Mă descurcam și fără	Sigur nu
4	9	-	9

- Completari de răspuns ale respondenților la chestionar la criteriul Sigur nu:
"Clar nu, Nu cred că m-aș fi descurcat la fel, La nivel național nu era finanțare"

- Condițiile de finanțare ale GAL vi s-au părut mai grele decât alte finanțări nerambursabile?

Cu siguranță da	Așa și așa	Mă descurcam și fără	Sigur nu
3	8	-	11

- Completari de răspuns ale respondenților la chestionar la criteriul Sigur nu:
"Mi s-a părut benefic, Condițiile de finanțare mi se par mai bune decât alte finanțări despre care m-am documentat, Nu"

- Relaționarea cu angajații GAL a fost facilă?

Cu siguranță da	Așa și așa	Mă descurcam și fără	Sigur nu
21	-	-	1

- Ați cunoscut oameni noi din domeniul unde activați sau din domeniul în care ați depus proiectul din zona vecină localității dvs. sau din afară?

Cu siguranță da	Așa și așa	Mă descurcam și fără	Sigur nu
18	1	-	3

- Modul în care angajații GAL lucrează este clar? Vi s-a explicat ce rol are GAL-ul pentru finanțarea proiectului dvs.?

Cu siguranță da	Așa și așa	Mă descurcam și fără	Sigur nu
-----------------	------------	----------------------	----------


22	-	-	-
----	---	---	---

- Finanțarea accesată prin GAL merită efortul timpului, banilor și nervilor investiți?

Cu siguranță da	Așa și așa	Mă descurcam și fără	Sigur nu
21	1	-	-

- În cazul în care ați dori să realizați un alt proiect, ați dori să fie finanțat prin GAL?

Cu siguranță da	Așa și așa	Mă descurcam și fără	Sigur nu
22	-	-	-

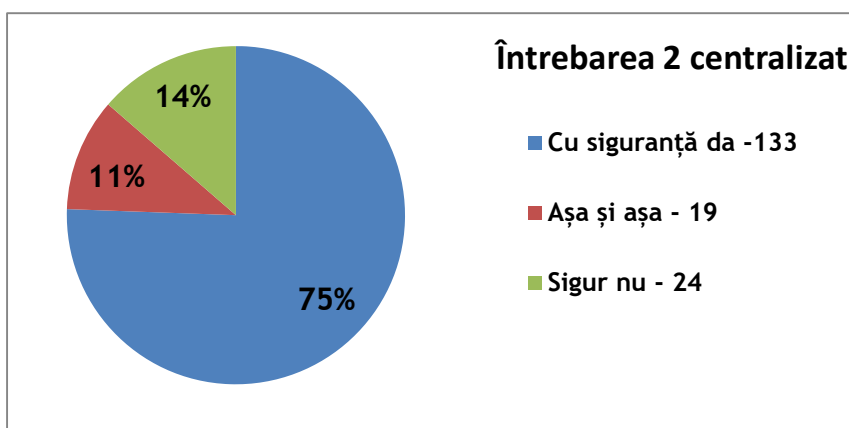

Chestionar aferent vizibilității și promovării GAL

Întrebarea 3:

Referitor la modul în care ați participat, ați văzut sau ați auzit despre evenimentele organizate de către GAL vă rugăm să ne precizați următoarele aspecte legate de promovarea, vizibilitatea și accesibilitatea acestora:

- Cum ați auzit/văzut despre Evenimentele GAL (Târgul Gospodăriilor de Produse Montane) :

Canale/locuri	Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
Website GAL	29	9	10
Primarie	30	6	12

Retele sociale (Facebook, etc..)	35	7	6
Pliante	29	10	9
Anunt/Reclama radio	31	7	10
Anunt/Reclama TV	22	7	19
Angajati GAL	43	3	2
Oameni din localitate	22	18	8
Emisiune Radio	28	8	12
Emisiune TV	26	10	12
Altele... <u>PRESA</u> <u>SCRISA</u> , email	6		1

Aprecierea respondenților pe criteriile de selecție pentru canale/locuri de comunicare considerate a fi cele mai bune sau cele cu care au interacționat cel mai bine din prisma unei accesibilități eficiente în cazul promovării evenimentelor GAL s-a clasat astfel:

Canale/locuri	Foarte mulțumit	Canale/locuri	Mulțumit	Canale/locuri	Nemulțumit
Angajati GAL	43	Oameni din localitate	18	Anunt/Reclama TV	19
Retele sociale (Facebook, etc..)	35	Pliante	10	Emisiune TV	12
Anunt/Reclama radio	31	Emisiune TV	10	Emisiune Radio	12
Primarie	30	Website GAL	9	Primarie	12
Website GAL	29	Emisiune Radio	8	Website GAL	10
Pliante	29	Retele sociale (Facebook, etc..)	7	Anunt/Reclama radio	10
Emisiune Radio	28	Anunt/Reclama radio	7	Pliante	9
Emisiune TV	26	Anunt/Reclama TV	7	Oameni din localitate	8
Anunt/Reclama TV	22	Primarie	6	Retele sociale (Facebook, etc..)	6
Oameni din localitate	22	Angajati GAL	3	Angajati GAL	2
Altele... <u>PRESA</u> <u>SCRISA</u> , email	6	Altele... <u>PRESA</u> <u>SCRISA</u> , email		Altele... <u>PRESA</u> <u>SCRISA</u> , email	1

➤ Cum vi s-a părut calitatea și utilitatea informațiilor auzite/văzute în general?

Canale/locuri	Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
Website Gal	28	13	7
Primarie	24	13	11
Rețele sociale (Facebook, etc..)	36	5	7
Pliante	24	10	14
Anunt/Reclama radio	29	6	13
Anunt/Reclama TV	25	7	16
Angajati GAL	36	10	2
Oameni din localitate	25	17	6
Emisiune Radio	28	10	10
Emisiune TV	27	10	11
Altele... <u>PRESA</u> <u>SCRISA</u>	3		1

Aprecierea calității și utilității informațiilor respondenților pe criteriile de selecție pentru canale/locuri de comunicare prin care informațiile oferite de GAL au ajuns la ei s-a clasat astfel:

Canale/locuri	Foarte mulțumit	Canale/locuri	Mulțumit	Canale/locuri	Nemulțumit
Retele sociale (Facebook, etc..)	36	Oameni din localitate	17	Anunt/Reclama TV	16
Angajati GAL	36	Website Gal	13	Pliante	14
Anunt/Reclama radio	29	Primarie	13	Anunt/Reclama radio	13
Website Gal	28	Angajati GAL	10	Primarie	11
Emisiune Radio	28	Emisiune Radio	10	Emisiune TV	11
Emisiune TV	27	Emisiune TV	10	Emisiune Radio	10
Anunt/Reclama TV	25	Pliante	10	Website Gal	7
Oameni din localitate	25	Anunt/Reclama TV	7	Retele sociale (Facebook, etc..)	7
Primarie	24	Anunt/Reclama radio	6	Oameni din localitate	6

Pliante	24	Retele sociale (Facebook, etc..)	5	Angajati GAL	2
Altele... <u>PRESA SCRISA</u>	3	Altele... PRESA SCRISA		Altele... PRESA SCRISA	1

➤ Cum și unde ați auzit/văzut prima dată despre GAL?

Canale/locuri	Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
Website Gal	19	10	19
Primarie	28	11	9
Retele sociale (Facebook, etc..)	24	6	18
Pliante	17	11	20
Anunt/Reclama radio	15	3	30
Anunt/Reclama TV	12	3	33
Angajati GAL	30	4	14
Oameni din localitate	17	10	21
Emisiune Radio	15	4	29
Emisiune TV	15	6	27
Targuri	24	5	19
Intalniri locale	31	6	11
Altele _____	2		3

Selecțiile respondenților, pe criterii pentru primul canal/loc de comunicare unde au auzit/văzut prima dată despre GAL, s-au clasat astfel:

Canale/locuri	Foarte mulțumit	Canale/locuri	Mulțumit	Canale/locuri	Nemulțumit
Intalniri locale	31	Primarie	11	Anunt/Reclama TV	16
Angajati GAL	30	Pliante	11	Pliante	14
Primarie	28	Website Gal	10	Anunt/Reclama radio	13
Retele sociale (Facebook, etc..)	24	Oameni din localitate	10	Primarie	11
Targuri	24	Intalniri locale	6	Emisiune TV	11
Website Gal	19	Retele sociale (Facebook, etc..)	6	Emisiune Radio	10

		etc..)			
Pliante	17	Emisiune TV	6	Website Gal	7
Oameni din localitate	17	Targuri	5	Rețele sociale (Facebook, etc..)	7
Emisiune TV	15	Angajati GAL	4	Oameni din localitate	6
Emisiune Radio	15	Emisiune Radio	4	Angajati GAL	2
Anunt/Reclama radio	15	Anunt/Reclama radio	3	Altele... PRESA SCRISA	1

- Pe care canale/locații de informare considerați că ar fi bine să se concentreze în viitor GAL-ul?

Canale/locuri	Foarte mulțumit	Mulțumit	Nemulțumit
Website Gal	30	8	10
Primarie	21	12	15
Rețele sociale (Facebook, etc..)	38	2	8
Pliante	24	12	12
Anunt/Reclama radio	26	9	13
Anunt/Reclama TV	27	8	13
Angajati GAL	33	5	10
Oameni din localitate	24	8	16
Emisiune Radio	28	11	9
Emisiune TV	28	11	9
Targuri	37	6	5
Intalniri locale	37	6	5
Altele	2		4

Selecțiile respondenților, pe criterii de selecție privind canalele/locurile de comunicare pe care ar trebui să se concentreze GAL-ul, s-au clasat astfel:

Canale/locuri	Foarte mulțumit	Canale/locuri	Mulțumit	Canale/locuri	Nemulțumit
Retele sociale (Facebook, etc..)	38	Primarie	12	Oameni din localitate	16
Targuri	37	Pliante	12	Primarie	15
Intalniri locale	37	Emisiune Radio	11	Anunt/Reclama radio	13
Angajati GAL	33	Emisiune TV	11	Anunt/Reclama TV	13
Website Gal	30	Anunt/Reclama radio	9	Pliante	12
Emisiune Radio	28	Oameni din localitate	8	Website Gal	10
Emisiune TV	28	Anunt/Reclama TV	8	Angajati GAL	10
Anunt/Reclama TV	27	Website Gal	8	Emisiune Radio	9
Anunt/Reclama radio	26	Targuri	6	Emisiune TV	9
Pliante	24	Intalniri locale	6	Retele sociale (Facebook, etc..)	8
Oameni din localitate	24	Angajati GAL	5	Targuri	5

7. CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE

Centralizarea intențiilor exprimate de beneficiari denotă faptul că GAL-ul are un rol important în teritoriu, nu numai din faptul disponibilității unor resurse financiare, dar utilitatea existenței lui apare și din faptul că există o comunicare permanentă, ușor de făcut, prin care sunt clarificate și înțelese situațiile la "firul ierbii".

Rezultatele dovedesc faptul că GAL-ul a evoluat mult de la înființarea lui, angajații GAL, liderii locali, alături de membrii cât și de beneficiari au dobândind **noi competențe**. Totodată și-au îmbunătățit **capacitatea de lucru și de abordare** a ideilor astfel încât prin GAL, s-a creat o **rețea de oameni** ce au înțeles rolul lor ca și grup, prin elaborarea și însușirea de **noi metode de lucru** ce le-au permis să atingă rezultate concrete. Interacțiunea permanentă cât și aceste rezultate au creat și au consolidat **convingerea mentală** că se pot dezvolta local idei benefice ce pot da un nou sens celor ce trăiesc aici și pot fi la rândul lor multiplicare.

Din toate aceste interacțiuni sentimentul de **încredere** a crescut atribuind GAL-ului notorietate locală în majoritatea sectoarelor în care există actori interesați și activi.

Considerăm astfel atins nivelul prin care se poate dovedi eficiența metodei LEADER la nivelul teritoriului GAL. Atât capitalul social cât și guvernanța locală au fost îmbunătățite prin munca susținută a echipei tehnice, acestea generând rezultate îmbunătățite, ce ar fi fost cu mult mai greu, dacă nu chiar imposibil de obținut altfel.

Modul de promovare s-a dovedit a fi unul eficient și poate fi menținut până la finalizarea prezentei SDL. Este de preferat a fi menținute recomandările privind lansările de apeluri estimate pentru 2019, astfel încât toate măsurile GAL să ajungă la beneficiarii locali.

Factorii de succes		Factorii de insucces	
Interni	Externi	Interni	Externi
- Angajații GAL - Partenerii - Perseverența și adaptabilitatea echipei tehnice GAL - Organizarea de evenimente locale - Permanenta orientare către rezultat	- Actori locali interesați de dezvoltarea zonei GAL - Zona montană cu multe resurse - Deschiderea autorităților pentru co-organizarea de evenimente - Clarificarea procedurilor și buna comunicare la nivelul AM-PNDR și Serviciul LEADER AFIR	- Comunicare insuficientă între membri și angajați a dus/duce uneori la neîncadrarea în termene și neasumarea de activități, acțiuni - Incompatibilități și animozități între persoane, crează situații în afara activității profesionale - Ambițiile actorilor locali, uneori în afara contextului, duc la întârzierea sau uneori sistarea unor proiecte	- Interpretările diferite ale procedurilor AFIR pe nivelurile de organizare județeană, regional, națională - Modificările procedurale și legislative continue

I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală

În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?	Puțin relevantă	Relevantă	Foarte relevantă
Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Puțin coerentă	Coerentă	Foarte coerentă

II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie

În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei?	În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Redusă	Medie	Ridicată
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER			
Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernantei locale)			
Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER	Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER	Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernantei la nivel local datorită aplicării metodei LEADER	Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
IV. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B			
În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură

CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B

Măsura	Alocarea publică totală
M8/6B - Investiții în infrastructură și servicii publice	778,638.00
M9/6B Investiții în infrastructura socială	30,689.00
M10/6B - Sprijin pentru integrarea minorităților locale	19,199.71
M11/6B - Dezvoltarea activității societății civile	104,940.05
Total arie de intervenție	933,466.76
